



Technical Offer



Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

AZOOM United Co.

العرض الفني

TECHNICAL OFFER

مقدم من



شركة عزوم المتحدة للمقاولات

لصالح



جمعية المودة
للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

لمنافسة

مشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال المباني لمشروع تجاري سكني

بتاريخ: 15/07/2026

الرقم: (ASF26071502)





AZOOM United Co.

ضمان السرية، حقوق الطبع والنشر والنسخ

لا يجوز إفشاء هذا العرض وجميع المستندات المقدمة سواء كانت الكترونية أو ورقية للتقييم الداخلي والنظر والدراسة فقط. ليس هناك جزء من هذه الوثيقة قد نسخت أو نقلت بأي وسيلة (الالكترونية، أو ورقية أو تسجيل أو أي وسيلة كانت) من غير إذن خطي مسبق من قبل شركة عزوم المتحدة للمقاولات.

ويحتوي هذا العرض وأي مستندات داعمة على معلومات سرية بالنسبة لشركة عزوم المتحدة للمقاولات وتم تقديمها على أساس أنها يجب ألا تستخدم بأي شكل أو تفسى إلى أي طرف ثالث بشكل كلي أو جزئي، باستثناء موظفي أو مستشاري العميل لأجل اعتبار هذا العرض أو خلاف ذلك بموافقة خطية مسبقة من عزوم المتحدة للمقاولات.

كافة المعلومات، والعروض، والبيانات، والآراء، والمقترحات بهذا العرض وأي مستندات داعمة والتي حسب علمنا صحيحة ودقيقة، لكنها لا يقصد بها (ولا يجب أن تؤخذ) تشكيل عرض قابل للقبول أو ملزم على نحو دائم، ما لم تصبح موضوعاً لاتفاق منفصل ومحدد بين الطرفين، نتطلع إلى مناقشة أي مواضيع تتعلق بنطاق العمل المقترح من قبلنا أو أي معلومات أخرى تكونوا في حاجة لها لدعم احتياجاتكم.





AZOOM United Co.

محتويات العرض الفني

جدول محتويات العرض الفني:

م	المحتوى	رقم الصفحة
1	معلومات الشركة	4
2	الملخص	5
3	من نحن	6
4	مشاريع سابقة	7
5	نطاق العمل	14
6	المتطلبات	14
7	فريق العمل	16
8	القدرات الفنية للشركة	17
9	المخرجات	24
10	المواصفات الفنية للمواد	25
11	بيانات الموظفين والعمال	30
12	الفريق المهني	32
13	المعدات والأجهزة	33
14	النهج والمنهجية	34
15	خطة العمل	35
16	مرحلة التحكم والرقابة	44
17	خطة إدارة المخاطر	47
18	مرحلة الاختبار	49
19	مرحلة التسليم	50
20	نماذج الصيانة والنظافة	51
21	الجدول الزمني للمشروع	57
22	مصفوفة المهام والمسؤوليات	59
23	إدارة الوثائق	60
24	التأثير البيئي والصحة والسلامة المهنية	65



**AZOOM** United Co.**معلومات الشركة**

المعلومات العامة		
اسم الشركة	شركة عزوم المتحدة للمقاولات	
عنوان الشركة	الرياض، 8272، طريق صلاح الدين الأيوبي، حي الضباط، 4504	
الخدمات التي نقدمها	المقاولات الانشائية، الأعمال المدنية، خدمات النظافة والصيانة العامة، الترميمات وصيانة المباني، تمديدات شبكات المياه، أعمال الطاقة والكهرباء، أعمال تعبيد الطرق والأرصفة، أعمال المياه والصرف الصحي، خدمات المشتريات والتوريدات، وغيرها ...	
تاريخ تأسيس الشركة	تأسست الشركة منذ العام 2017م حيث وضعنا بصمتنا وتواجدنا في المنطقة وذلك بجودة العمل الذي نقدمه والمصداقية مع العملاء.	
الوضع القانوني للشركة	ذات مسؤولية محدودة	
اسم المالك	سلطان عايد ضيف الله الدلبي	
رقم السجل التجاري	1010467099	
بيانات التواصل		
المستوى	الأول	الثاني
الاسم	م . يحيى ال سلامه	م. وليد
المنصب الوظيفي	مدير تنفيذي	مدير عام المشاريع
الايميل	yahya@Azoomunited.com	Waleed.m@Azoomunited.com
رقم الجوال	0500077006	





AZOOM United Co.

عن الشركة

تأسست شركة عزوم المتحدة للمقاولات سنة 2017م وهي واحدة من اهم الشركات السعودية الرائدة في مجال المقاولات والانشاءات والتأهيل، وتتميز بتوفير طيف واسع من الخدمات الهندسية المتخصصة التي تواكب التطورات الحديثة لتحقيق المتطلبات والمتغيرة للقطاعات المختلفة من خلال تقديم حلول عقارية إبداعية وبطرق مبتكرة وغير تقليدية وبناء عليه ستقوم شركة عزوم المتحدة للمقاولات بتنفيذ أعمال مشاريع الانشاءات في المملكة العربية السعودية أو خارجها،

وسيتم العمل وفق منهجيات إدارة المشاريع لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية عالية.

كما أن شركة عزوم شركة متخصصة في مجال أعمال المقاولات، والبناء، والانشاءات، والتأهيل.

ولقد نفذنا العديد من المشاريع الكبرى بمختلف مناطق المملكة وبجودة عالية ودقة متناهية في المواعيد وبضمان على جميع الأعمال وسيتم الامتثال لجميع المعايير والمنهجيات لضمان تقديم أفضل الخدمات والنتائج.





AZOOM United Co.

جدول المراجع والبيانات لبعض مشاريع الانشاءات:

عدد المعدات	قيمة العقد (ريال سعودي)	مدة التنفيذ بالتاريخ		بيانات العقد / المشروع			
		الى	من	نوع العمل	رقم الهاتف	عنوان العميل	اسم العميل
22	80000000	2025/10	2024/09	انشاء وتشطيب وتأثيث (تسليم مفتاح)	558338548	الرياض، المملكة العربية السعودية	فندق هوليداي ان الملز
4	99.998	2025/1	2024/11	إنشاء وتشغيل بوابات الطوارئ مطار حائل	555690368	الرياض، المملكة العربية السعودية	تجمع مطارات الثاني
50	50,320,000	2018/1م	2016/12م	انشاء وتشطيب مهاجع جنود قاعدة الملك عبد العزيز بالشرقية	509246865	الرياض، المملكة العربية السعودية	شركة مسعود ال حيدر للمقاولات
41	49,998,000	2018/3م	2017/2م	انشاء وتشطيب القرية الذاتية بمنطقة نجران	508392061	الرياض، المملكة العربية السعودية	شركة مجدول العقارية
59	68,900,000	2018/5م	2017/2م	انشاء وتشطيب متوسطة عبدا لله بن الزبير بالقريات	509246865	الرياض، المملكة العربية السعودية	شركة مسعود ال حيدر للمقاولات
32	36,220,500	2320/3م	2120/4م	انشاء مبنى فندق هوليداي ان - الملز	508392061	الرياض، المملكة العربية السعودية	شركة السلامة للمقاولات
29	30,950,000	2019/11م	2018/12م	انشاء المستودعات وتأهيلها وأعمال الطرق والأرصفة	553867096	الرياض، المملكة العربية السعودية	شركة مجدول العقارية



Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026





Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026





Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

DK DESIGNERS



DK DESIGNERS







Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026







Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026







Technical Offe



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

الترقيم
التاريخ
الترقيم

Cluster 2
تجمع مطارات الثاني

شهادة إنجاز			
رقم خطاب التعميد:	٤٤٠٠٠٠٠٠٨٥	تاريخه:	٢٠٢٥/٠٦/١٢ م
المورد المنشأ:	شركة عزوم المتحدة للمقاولات		
وصف العمل:	مشروع إنشاء أبواب المقارن بصالات السفر في مطار حائل الدولي		
الجهة المستفيدة:	مطار حائل الدولي		
م	الوصف	الوحدة	الكمية
١	باب رقم ١ - توريد وتركيب باب زجاجي بإبعاد ٢١٥٠ × ٩٠٠ مم مع إطار ألومنيوم مقاوم للحريق متضمناً أعمال الفك للباب الحالي والتجهيزات اللازمة لتركيب الباب الجديد ويشمل ذلك جميع الأكسسورات اللازمة وسكل مايلزم لانتهاء الأعمال حسب اشتراطات السلامة والدفاع المدني في منطقة الوصول جهة الجمهور.	عدد	١
٢	باب رقم ٢ - توريد وتركيب باب معدني بإبعاد ٢١٥٠ × ٩٠٠ مم مع إطار ألومنيوم مقاوم للحريق متضمناً أعمال الفك للباب الحالي والتجهيزات اللازمة لتركيب الباب الجديد ويشمل ذلك جميع الأكسسورات اللازمة وسكل مايلزم لانتهاء الأعمال حسب اشتراطات السلامة والدفاع المدني في منطقة انهاء إجراءات السفر وقيل المغادرة النهائية.	عدد	١
٣	باب رقم ٣ - ٤ - ٥ - توريد وتركيب باب معدني بإبعاد ٢١٥٠ × ٩٠٠ مم مع إطار ألومنيوم مقاوم للحريق متضمناً أعمال الفك للباب الحالي والتجهيزات اللازمة لتركيب الباب الجديد ويشمل ذلك جميع الأكسسورات اللازمة وسكل مايلزم لانتهاء الأعمال حسب اشتراطات السلامة والدفاع المدني جهة الجمهور.	عدد	٣
٤	باب رقم ٥ - توريد وتركيب باب زجاجي بإبعاد ٢١٥٠ × ٩٠٠ مم مع إطار ألومنيوم مقاوم للحريق متضمناً أعمال الفك للباب الحالي والتجهيزات اللازمة لتركيب الباب الجديد ويشمل ذلك جميع الأكسسورات اللازمة وسكل مايلزم لانتهاء الأعمال حسب اشتراطات السلامة والدفاع المدني.	عدد	١
نشهد بأن الكمية والمواصفات المذكورة أعلاه قد تم إنجازها من قبل المقاول المعتمد وهي مقبولة من قبل شركة تجمع المطارات الثاني وقد تم إستلامها من قبل المختصين بمطار حائل الدولي وذلك بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م.			

+966114880122

هاتف

Saudi Arabia - Riyadh - 12623 Post Code

المملكة العربية السعودية - الرياض - الرمز البريدي ١٢٦٢٣

1010467099

سجل تجاري





التاريخ: 05 /06 /1440هـ
الموافق: 12 / 01 / 2019م
صادر 1438 - 0414

شهادة انجاز

تشهد شركة مسعود بالعيد ال حيدر وشركاه للتجارة والمقاولات بأن شركة عزوم المتحدة للمقاولات قد نفذت مشروع انشاء وتشطيب مهاجع الجنود بقاعدة الملك عبد العزيز بالشرقية، حيث تم التنفيذ حسب البيانات في الجدول التالي:

م	البند	الوصف
1	انشاء المباني	جميع أعمال بناء مباني المهاجع كاملة
2	انشاء الهناجر	اعمال انشاء الهناجر المحيطة بالمهجع بشمل كامل
3	أعمال التشطيبات	أعمال التشطيبات العامة للمباني والهناجر وأعمال التشطيبات النهائية
اجمالي قيمة المشروع رقما		50,320,000 ريال سعودي
اجمالي قيمة المشروع كتابة		اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف ريال سعودي

حيث قام بتنفيذ المشروع حسب المواصفات والشروط المتفق عليها وفي الوقت المحدد للتنفيذ وهو 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد، وذلك بتاريخ: 05/01/2017م. بقيمة اجمالية (50,320,000) خمسون مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألف ريالاً سعودياً فقط. وعليه فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للشركة على مجهوداتهم الرائعة على انجاز المشروع المذكور بالجدول أعلاه بالجودة المطلوبة وقبل الوقت المحدد والذي يبين مدى الاستعداد الفني والإداري الذي تمتلكه الشركة.

شركة مسعود بالعيد حيدر ال حيدر
للتجارة والمقاولات
الإدارة العامة





Technical Office



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026



شركة مجدول العقارية
Majdoul Real Estate Co

22-03-2018

12-1032018

شهادة أنجاز الأعمال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:-

يسر شركة مجدول العقارية أن تقدم شهادة الإنجاز لشركة عزوم المتحدة للمقاولات لإنجازها أعمال انشاء وتشطيب القرية الذاتية لمنطقة نجران تشمل المباني وأعمال الهناجر والتشطيبات وتوفير المواد اللازمة للتشطيبات. وذلك من الفترة 2017/02م الى الفترة 2018/03م بقيمة عقد اجمالية وقدرها (49,998,000) ريال سعودي حيث أنجزت الشركة الأعمال في الوقت المحدد وطبقا للمواصفات،
مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق.
وتقبلوا تحياتي،،

المدير العام



شركة مجدول العقارية
Majdoul Real Estate Co
C.R : 1010662213



920033471



www.Majdoul.sa



+966114880122

هاتف

Saudi Arabia - Riyadh - 12623 Post Code

المملكة العربية السعودية - الرياض - الرمز البريدي ١٢٦٢٣

1010467099

سجل تجاري





Technical Offe



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026



التاريخ: 1440/ 12 / 14 هـ
الموافق: 2019/ 08 / 15 م
صادر 0821 - 1439

شهادة انجاز

تشهد شركة مسعود بالعيد ال حيدر وشركاه للتجارة والمقاولات بأن شركة عزوم المتحدة للمقاولات قد نفذت مشروع متوسطة عبد الله بن الزبير بالقريات ، حيث تم التنفيذ حسب البيانات في الجدول التالي:

م	البند	الوصف
1	انشاء المباني والصالة الرياضية	جميع أعمال البناء للمشروع
2	الملعب الرياضي	تأهيل وبناء الملعب الرياضي بالكامل
3	أعمال التشطيبات	أعمال التشطيبات العامة والنهائية للمشروع
	اجمالي قيمة المشروع رقما	21,900,000 ريال سعودي
	اجمالي قيمة المشروع كتابة	واحد وعشرون مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي

حيث قام بتنفيذ المشروع حسب المواصفات والشروط المتفق عليها وفي الوقت المحدد للتنفيذ وهو 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد، وذلك بتاريخ: 2017 / 02 / 01 م. بقيمة اجمالية (68,900,000) ثمانية وستون مليوناً وتسعمائة ألف ريالاً سعودياً فقط. وعليه فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للشركة على مجهوداتهم الرائعة على انجاز المشروع المذكور بالجدول أعلاه بالجودة المطلوبة وقبل الوقت المحدد والذي يبين مدى الاستعداد الفني والإداري والهندسي الذي تمتلكه الشركة.

شركة مسعود بالعيد حيدر ال حيدر
للتجارة والمقاولات
الإدارة العامة



Kingdom of Saudi Arabia, Najran
Mobile: 0509778964
Website: www.mbhaiderc.com
Email: info@mbhaiderc.com

+966114880122
هاتف

Saudi Arabia - Riyadh - 12623 Post Code
المملكة العربية السعودية - الرياض - الرمز البريدي ١٢٦٢٣

1010467099
سجل تجاري





Technical Offe



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026



شركة مجدول العقارية
Majdoul Real Estate Co

08-12-2019

7-1122018

شهادة أنجاز الأعمال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:-

يسر شركة مجدول العقارية أن تقدم شهادة الإنجاز لشركة عزوم المتحدة للمقاولات لإنجازها أعمال المباني والمستودعات والتي تشمل أعمال البناء وانشاء المستودعات وتأهيلها وأعمال التشطيبات وتمديدات شبكات المياه والكهرباء في مدينة الدمام. وذلك من الفترة 2018/12م الى الفترة 2019/11م بقيمة عقد اجمالية وقدرها (30,950,000) ريال سعودي حيث أنجزت الشركة الأعمال في الوقت المحدد وطبقا للمواصفات،

مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق.

وتقبلوا تحياتي،،

المدير العام



شركة مجدول العقارية
Majdoul Real Estate Co
C.R : 1010662213



920033471



www.Majdoul.sa



+966114880122

هاتف

Saudi Arabia - Riyadh - 12623 Post Code

المملكة العربية السعودية - الرياض - الرمز البريدي ١٢٦٢٣

1010467099

سجل تجاري





Technical Office



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

	Project	Client	Area	P.O Date
1	Electrical Rooms & Duct Banks.	 First Fix	King Khalid International Airport – Cargo Area	11-May-2024
2	Fence Works.	 First Fix	King Khalid International Airport – Cargo Area	11-May-2024
3	Construction Taiba building.	 Cluster² جمعية المودة للتنمية الأسرية Al Khaleelah Society for Family Development	Jeddah	14 Sep-2024
4	Maintenance works.	 Cluster² تجمع مطارات الثاني	Hail Airport	18-Sep-2024
6	Renovation works.	 Eighty Real Estate	Al-Farsi Tower - Jeddah	30-May-2024
7	Construction Al-Shiqry Private Farm with 3 Villas	 ALBAS ATEEN الجبساتير	AL-Riyadh	6-Sep-2024
8	Concrete Works – Seven Project.	 HASSAN ALLAM & SEVEN CONSTRUCTION	Al-kharj	25-Sep-2024
9	Build a holiday Inn Hotel – Alsalamah Group.	 Holiday Inn	King Abdul Aziz Rd – Almalaz Riyadh	5/Jan/2022
10	Concrete Works – Al Deriyah Gate	 salini saudi arabia شركة ساليني العربية السعودية المحدودة	Al - Diryah	20-Sep-2024



Technical Office



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

جدول المشاريع الحالية وبيانات التعاقد والانشاءات قيد التنفيذ:

عدد المعدات	قيمة العقد (ريال سعودي)	مدة التنفيذ بالتاريخ		بيانات العقد / المشروع			
		الى	من	نوع العمل	رقم الهاتف	عنوان العميل	اسم العميل
51	15,070,000	حتى الان	Jul-25	إنشاء مبنى وقف طبية التجاري	533888228	جدة	جمعية المودة للتنمية الأسرية
45	تم توقيع اتفاقية عدم إفصاح	جاري الانتهاء	Mar-25	أعمال ترميم - برج الفارسي	560004814	الرياض	شركة الثمانين العقارية
18	تم توقيع اتفاقية عدم إفصاح	حتى الان	Sep-25	اعمال تشطيبات إسكان الحرس الوطني		جدة	شركة بن لادن
25	تم توقيع اتفاقية عدم إفصاح	حتى الان	Dec-25	اعمال تشطيبات فندق العثيم بععر		الرياض	شركة العثيم للاستثمار




Technical Office



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

الهيكل الإداري الخاصة بالشركة

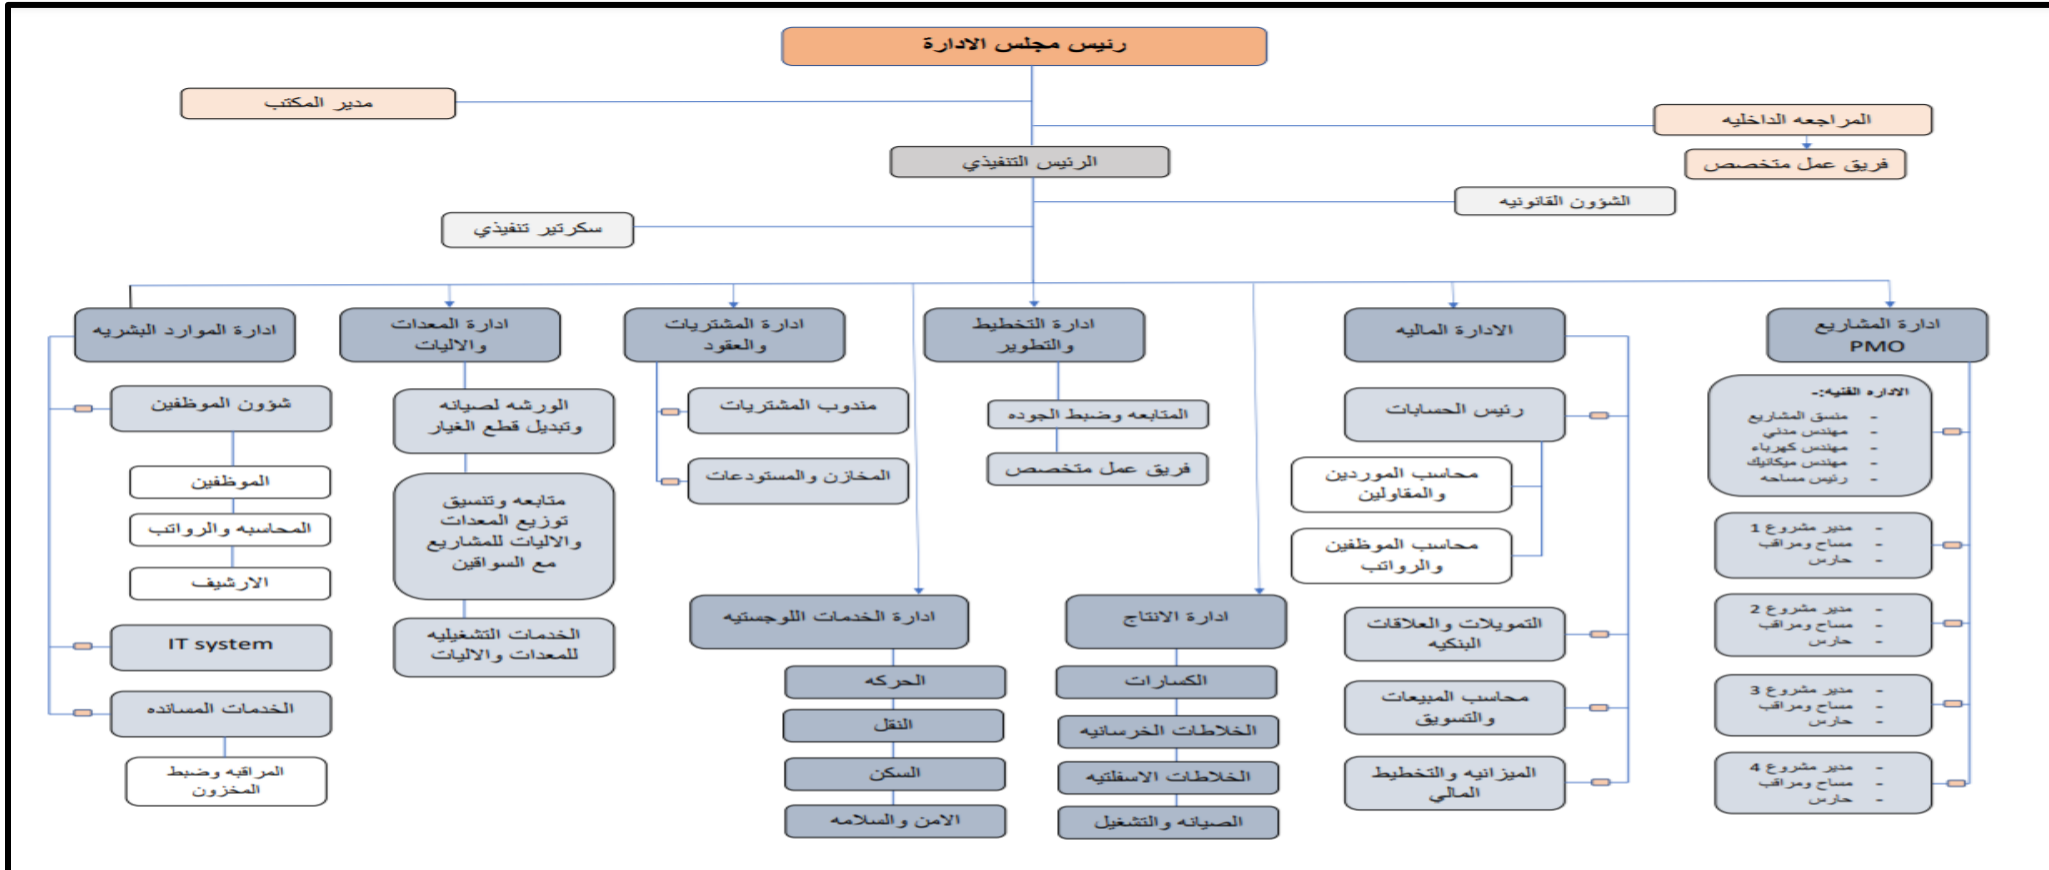




Technical Office



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

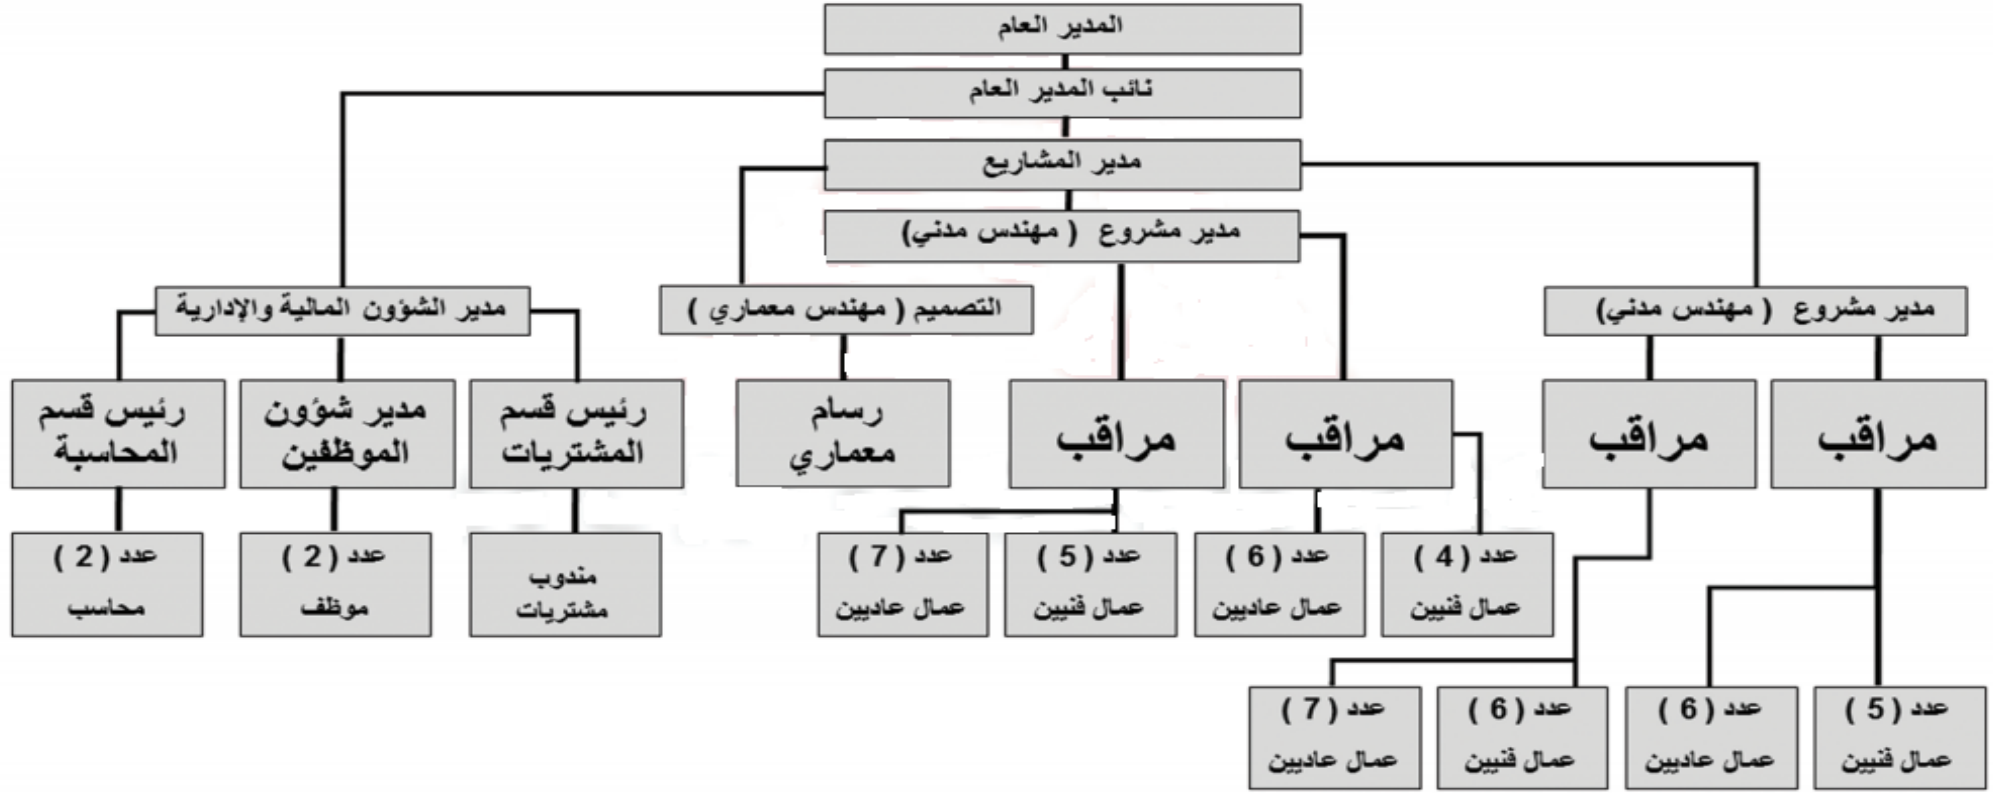



بيانات الموظفين والعمال

جدول بيانات بعض الموظفين وعمال وسنوات الخبرة:

م	اسم الموظف / العامل	نوع الوظيفة	الجنسية	الشهادة	سنوات الخبرة
1	سلطان عايد الدلبي	المدير التنفيذي	سعودي	ماجستير إدارة اعمال	18
2	سلمان ضيف الله العتيبي	نائب المدير	سعودي	بكالوريوس إدارة أعمال	15
3	عبد الله محمد الطيبي	مدير المشاريع الصناعية	سعودي	بكالوريوس هندسة ميكانيكا	17
4	تركي إبراهيم عبد الله الجابر	كبير مهندسين	سعودي	بكالوريوس هندسة مدنية	7
5	محمد عبد الله العنيزي	رئيس قسم الصيانة	سعودي	بكالوريوس هندسة مدنية	8
6	عبد الله احمد القرني	مدير المبيعات	سعودي	بكالوريوس هندسة مدنية	8
7	ناصر اليامي	مدير الموارد البشرية	سعودي	بكالوريوس إدارة أعمال	10
8	احمد عبد الرحمن الغامدي	المدير المالي	سعودي	بكالوريوس إدارة أعمال - محاسبة	10
9	سالم سلطان السالمي	المدير الفني	سعودي	بكالوريوس هندسة مدنية	10
10	زكرياء يحيى الشيباني	مدير المشتريات	سعودي	بكالوريوس هندسة معمارية	10
11	محمد إسماعيل حسين محمد	مهندس وريدية	أجنبي	بكالوريوس هندسة مدنية	8
12	احمد ثروت	مهندس مدني	أجنبي	بكالوريوس هندسة مدنية	10
13	احمد إسماعيل	مهندس معماري	أجنبي	بكالوريوس هندسة معمارية	10
14	محمد رازو ميا	نجار	أجنبي	ثانوية	8





6	ثانوية	أجنبي	دهان	الأمين حبيب الرحمن	15
5	بكالوريوس ميكانيكا	أجنبي	مهندس ميكانيكا	محمد ابو سعيد	16
5	ثانوية	أجنبي	مليس	محمد رجال أمير جمال	17
7	بكالوريوس كهرباء	أجنبي	كهربائي	محمد رحمن الله أنصاري	18
6	ثانوية	أجنبي	مشرف عمال	مجدي قاسم	19
6	ثانوية	أجنبي	سباك	محمد جبير	20
6	ثانوية	أجنبي	عامل	ميمون مياه حبيب اسلام	21
5	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد سوجان أبو القاسم	22
5	ثانوية	أجنبي	عامل	سعدات حسين مادو مياه	23
6	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد شهيد الله محمد	24
5	ثانوية	أجنبي	عامل	انار مسلم الدين	25
6	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد سعدات حسين	26
6	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد مقبول حسين	27
7	ثانوية	أجنبي	عامل	عاشور الرحمن كبير	28
8	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد علاء الدين فضل	29
6	ثانوية	أجنبي	عامل	اشون علي محمد عابد	30
6	ثانوية	أجنبي	عامل	امير الاسلام محمد اساني	31
6	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد سالم	32
8	ثانوية	أجنبي	عامل	احمد عمر محمد	33
6	ثانوية	أجنبي	عامل	شازاد علي	34
8	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد روهان	35
7	ثانوية	أجنبي	عامل	علي ساري	36
7	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد باهار علي	37
6	ثانوية	أجنبي	عامل	رسول محمد رسول	38
6	ثانوية	أجنبي	عامل	مد راج راج	39
8	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد كولي	40
8	ثانوية	أجنبي	عامل	سردار محمد	41
5	ثانوية	أجنبي	عامل	رواس متا	42
8	دبلوم ميكانيكا	أجنبي	فني انذار حريق	احمد محمد قاسم	43
6	ثانوية	أجنبي	مليس	عبد الولي محمد عبدالله	44





8	بكالوريوس كهرباء	أجنبي	كهربائي	محمد السيد محمد	45
5	ثانوية	أجنبي	فني نجارة	عبد الله سالم	46
8	دبلوم كهرباء	أجنبي	فني كهربائي	احمد الشرفاوي	47
7	دبلوم ميكانيكا	أجنبي	فني صيانة	عبد الله بهاء	48
7	دبلوم ميكانيكا	أجنبي	فني صحة وسلامة مهنية	امير السيوطي	49
6	ثانوية	أجنبي	فني حدادة	هيثم صالح	50
6	دبلوم كهرباء	أجنبي	فني أنظمة التيار الخفيف	سلمان عبد القوي صالح	51
8	دبلوم كهرباء	أجنبي	فني كهرباء	ضياء الحق محمد	52
8	دبلوم ميكانيكا	أجنبي	فني برادات وغرف تبريد	روهان علي	53
5	دبلوم ميكانيكا	أجنبي	فني تدفئة وتهوية وتكييف	مد شازاد	54
6	ثانوية	أجنبي	عامل	حسنات علي	55
7	ثانوية	أجنبي	عامل	محمد أحمد محمد	56





الفريق المهني لدينا:

م	المهنة	عدد العمال
1	مهندس تنفيذي	8
2	مشرف مواقع	12
3	مهندس مساحة	4
4	مهندس تخطيط	3
5	مهندس كهرباء	7
6	مهندس زراعي	2
7	فني ميكانيكا	20
8	فني صيانة	30
9	فني صحة وسلامة مهنية	20
10	فني مكافحة افات	15
11	فني أنظمة التيار الخفيف	20
12	فني كهرباء	18
13	فني برادات وغرف تبريد	18
14	فني تدفئة وتهوية وتكييف	18
15	نجار	20
16	سباك	20
17	دهان	20
18	عامل زراعي	4
19	عامل تحميل وتنزيل	14





النهج والمنهجية

منهجيتنا في إدارة العمل ستكون قائمة بشكل أساسي على مبادئ وأساليب إدارة المشاريع الشاملة التي تم سنعتمد في هذا المشروع المنهجية الهجينة والتي تتيح لنا العمل والتي (PMI) توضيحها في دليل معهد إدارة المشاريع ستعتمد على معايير وأدوات موثوقة لضمان أن المشروع يتقدم بالفعالية والكفاءة العالية التي نطمح إليها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ الأعمال بطريقة متوازنة، مما يعني أن العديد من المهام يمكن أن تجري في نفس الوقت لزيادة كفاءة الإنتاج والحفاظ على جدول زمني متوازن. لضمان النجاح الكلي للمشروع، سنقسم المشروع إلى مراحل رئيسية، تشمل كل منها مجموعة محددة من المهام والأعمال:

- مرحلة التخطيط: في هذه المرحلة، سنحدد الأهداف ونخطط للمهام والأنشطة اللازمة لتحقيقها.
- مرحلة التنفيذ: هنا سننفذ الأنشطة المخطط لها ونحقق المخرجات المتوقعة.
- مرحلة التحكم والرقابة: هذه المرحلة تتضمن المراقبة الدورية للمشروع والتحكم فيه لضمان اتباع الجدول الزمني.
- مرحلة الاختبار: في هذه المرحلة، سنقوم بتقييم المخرجات المنجزة بشكل شامل لضمان أنها تلي الأهداف والمتطلبات المحددة. الاختبار سيضمن، ولكن لا يقتصر على، الاختبارات الوظيفية والأداء والتوافق، حيث يتم التركيز على جوانب مثل





- الجودة، الأمان، والاستقرار. هذه المرحلة تمكننا من التعرف على أي مشكلات أو عيوب قد تظهر، وإصلاحها قبل التسليم النهائي للمشروع.

مرحلة التسليم: في هذه المرحلة، سنقوم بتسليم النتائج النهائية للجهة المستفيدة ونقوم بالتأكد من رضاها وقبولها للمخرجات.





الخطة التشغيلية للإدارة المشروع

يسر شركة عزوم المتحدة للمقاولات ان تضع أمامكم خطة تشغيل مشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال المباني لمشروع تجاري سكني والتي تشتمل على تطبيق لكافة بنود الشروط والمواصفات متلاقية كافة السلبيات التي عادة ما تظهر خلال فترات التشغيل الأولي وخاصة أثناء مراحل الاحلال وتتعهد الشركة بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة بكفاءة عالية والعمل على تطوير الاداء حتى يرقى الي المستوي المنشود.


إيضاح هام:

إن الخطة التشغيلية المرفقة لسعادتكم تمثل رؤية عامة للشركة عن كيفية أداء العمالة والمعدات للقيام بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في الشروط والمواصفات ونود ان **نلفت** **انتباه** سعادتكم ان ما قدمناه هو عمل يخضع للنقد الجزئي والكامل لكل ما أوردناه ولیمثل أي التزام على **جمعية المودة للتنمية الاسرية بأي** مما جاء فيه من حيث الاعداد المخصصة للخدمات وتوزيعها على المناطق مع التزامنا الكامل بأي تعديلات بالحذف أو بالإضافة لكافة عناصر المشروع من العمالة والمعدات بما لا يخل بالشروط والمواصفات.





الهيكل للمشروع

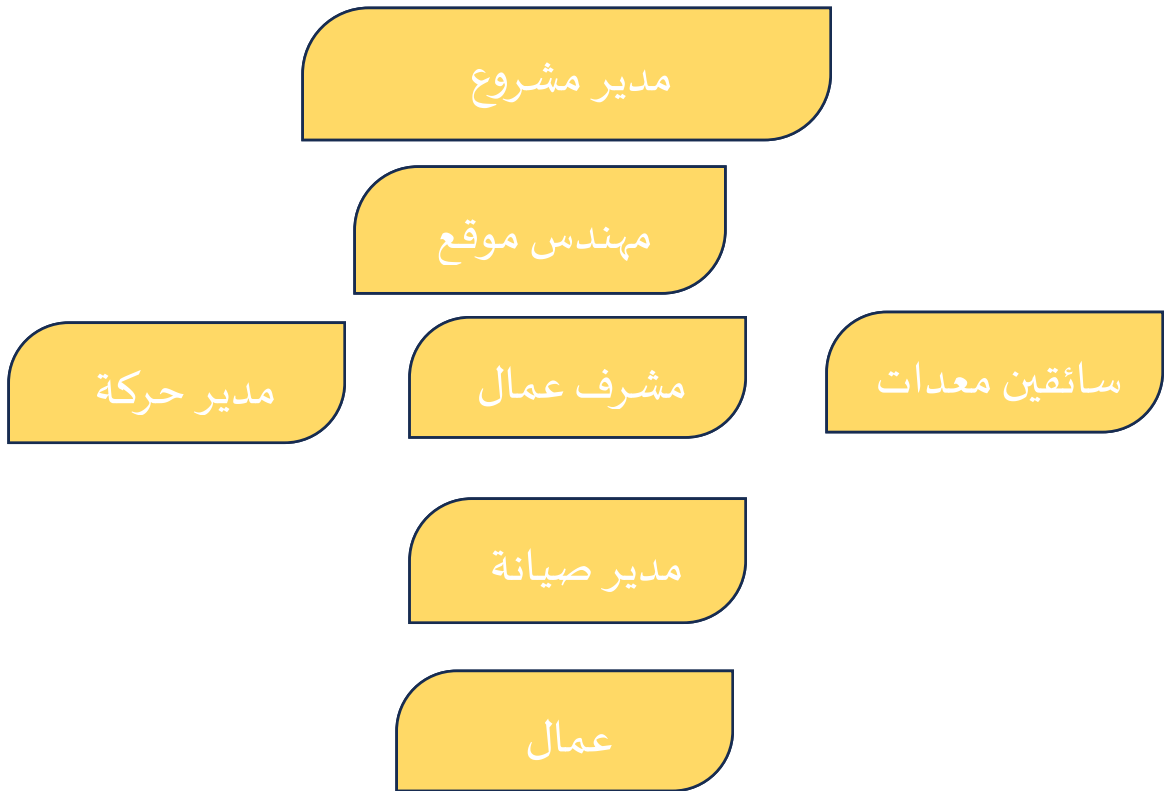



الخطة العامة التشغيلية أسس إعداد خطة التشغيل

تم وضع الخطة التشغيلية بناء على الأسس التالية: -

1. البيانات الاسترشادية والمعدلات المنصوص عليها بالشروط والمواصفات.
2. الدراسات الميدانية ومنتج عنها من معدلات وبيانات واقعية.
3. الخبرات السابقة في مجال الصيانة والتشغيل.

الهدف من الخطة:

تهدف الخطة إلى تنفيذ التزامات العقد واضعين في الاعتبار النقاط التالية: -

- توضيح الكيفية التي سيتم تنفيذ الالتزامات بموجبها أثناء مرحلة التشغيل لكافة عناصر الخدمات.
- تحديد الأساليب التشغيلية لكل من الخدمات المطلوبة.
- أداء كافة الخدمات والالتزامات المتعلقة بها طبقا للجدول الزمني للمشروع ومستويات الأداء
- توضيح الطريقة والأدوات والمعدات والعمالة المتوفرة لدى المقاول لتنفيذ عملية الصيانة
- استغلال المعدات الاستغلال الأمثل في تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في العقد

نتائج الدراسات الميدانية :

اسفرت مرحلة التحضير وما تخللها من دراسات ميدانية وأكاديمية، على العديد من الركائز، التي تم وضعها موضع الاهتمام والتحليل، لاختيار انسب الوسائل والامكانيات





وفق اساليب تشغيل متطورة قادرة على تنفيذ الأعمال والخدمات المنصوص عليها
بالشروط والمواصفات ومستندات
العقد من خلال خطة تشغيل توضح الصورة التي سيتم العمل بها خلال مرحلة التنفيذ،
وتفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لمنطقة العقد، وقد كانت الركائز في إعداد هذه الخطة
تعتمد على النتائج التالية:
أولاً: بيانات منطقة العمل (حدود ومشمولات منطقة العقد، والتقسيمات التشغيلية).
ثانياً: الهياكل التنظيمية والوظيفية القادرة على ادارة الأعمال والخدمات، والدالة على
حجم.

التنظيم للتأكد من المستوى الجيد للخدمات.

رابعاً: الوسائل والامكانيات اللازمة لتنفيذ كافة الالتزامات التشغيلية

خامساً: تحديد وتصنيف الاعمال والخدمات والالتزامات المتعلقة بها.

التجهيز

1/1 فترة التجهيز:

وهي ما بين توقيع العقد والبدء في تنفيذ المشروع ويتواجد بهذه الفترة كبار المسؤولين، ويعين
جهاز فني وإداري وتوزع الأدوار والمسئوليات عليهم، لدراسة جوانب المشروع، حسب شروط
ومواصفات العقد لوضع الخطط.

2/1 المكتب الإداري:

سوف يتم تجهيز مكتب إداري وتجهيزه بما يلزم من أثاث وأجهزة وأدوات وتفعيل وسائل
التواصل

3/1 العمال والفنيين:





العمال والفنيين: سوف يتم استقدام ما يلزم من عماله والفنيين بعدة تخصصات وتدريبها مع تحديد المسار وتوزيع الأعمال والمهام المكلفين بها حسب الخطة.

4/1 المعدات والآليات:

المعدات والآليات: سوف يتم توفير ما يلزم من المعدات والآليات بأنواعها وأحجامها وذات طراز حديث وتجربتها وتدريب من يقوم بالعمل عليها وتحديد مسارها وتوزيعها حسب الخطة.

5/1 الأدوات والمواد المستهلكة:

الأدوات: سوف توفير ما يلزم من أدوات لتنفيذ الأعمال.
المواد المستهلكة: سوف يتم توفير ما يلزم من مواد المطلوبة لتنفيذ الأعمال.

6/1 الزي الموحد:

الزي الموحد: سوف يتم توفير الزي الموحد للعمال وما يلزم لسلامة.

الخدمات المقدمة لمشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال المباني لمشروع تجاري سكني

1/تنفيذ اعمال خدمات أعمال مشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال المباني لمشروع تجاري سكني

2/توريد وتنفيذ جميع ما يلزم لتمام العمل وحسب الشروط والموصفات الواردة في كراسة الشروط والموصفات

3/تنفيذ جميع الاعمال والتجهيزات والإصلاح وسائل السلامة

4/توزيع المعدات والعمالة

5/في اعمال النظافة لإنجاز اللازم حسب المواصفات

6/الالتزام بالأسعار المقدمة في جدول الكميات

وسائل السلامة وتشمل :






- 1/ إزالة العناصر التالفة من وسائل السلامة
- 2/ تعديل الاشارات الارشادية المائلة بجميع انواعها
- 3/ تنظيف المكاتب الرئيسية والمستودعات **الخاصة** بتنفيذ مشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية واعمال المباني لمشروع تجاري سكني .
- 4 تنظيف الساحات وقاعات الطعام
- 5 تنظيف وصيانة دورات المياه
- 6 صيانة وتنظيف جميع المرفقات التابعة (مشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية واعمال المباني لمشروع تجاري سكني).

الطاقم الفني للمشروع:

آلية ونظام تنفيذ الصيانة والنظافة:

يتم تقسيم المشروع لفرق صيانة ونظافة يتم تعيين مشرف او مراقب لكل فرقة حسب الجدول
الموضح ويتم تكرار توزيع دوريات حسب المهندس المشرف علي المشروع



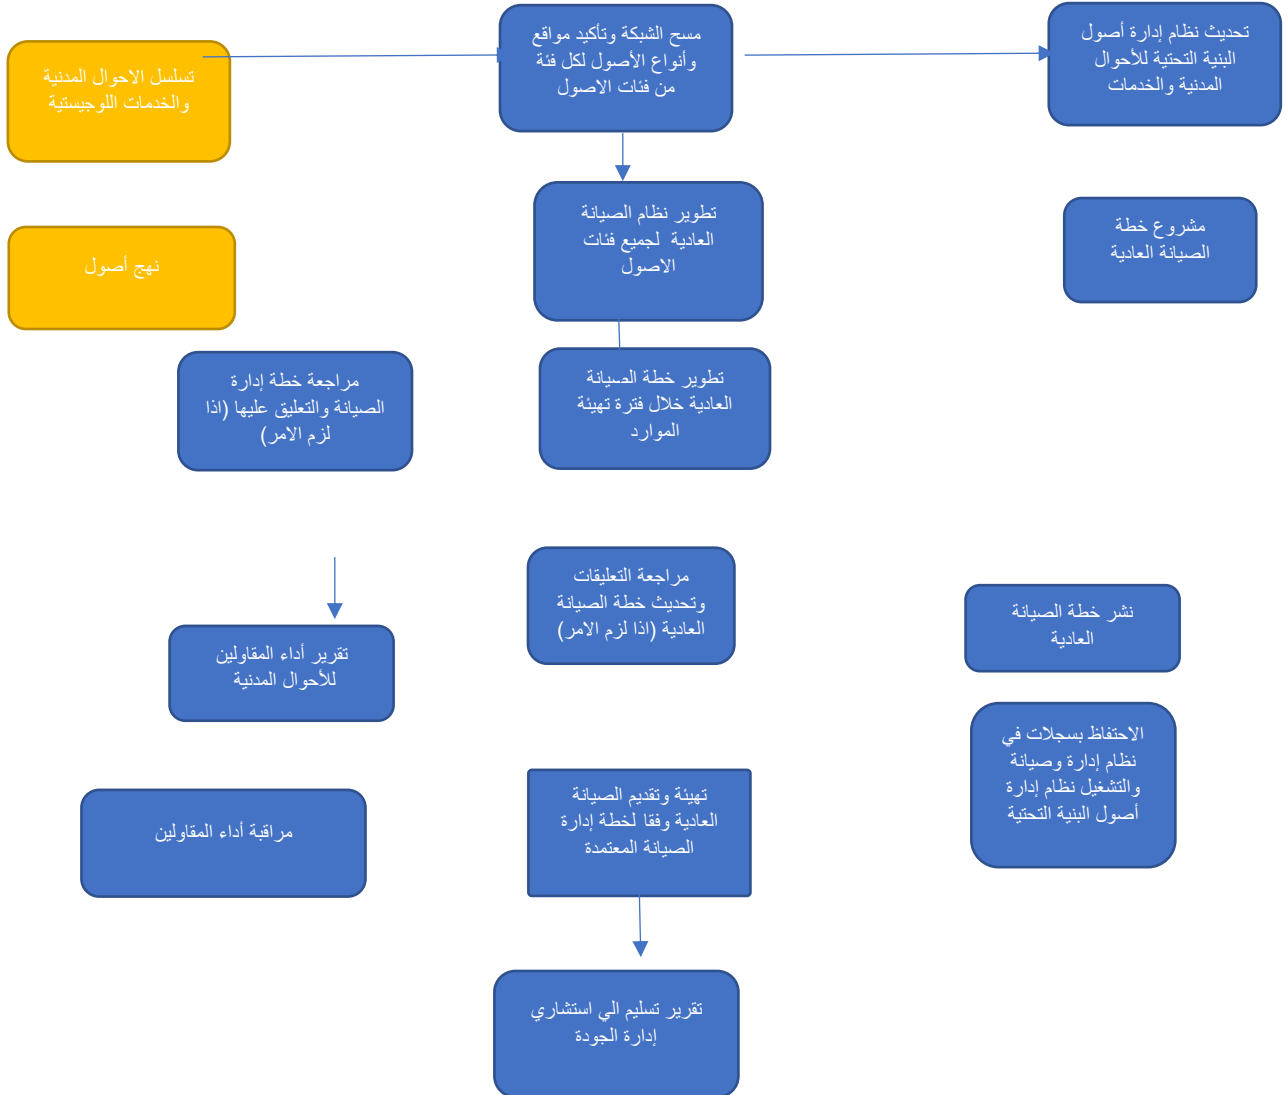



كيفية تنفيذ الاعمال

المشروع اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. نحن ندرك أن وضوح النطاق من الأهمية بمكان لضمان نجاح المشروع. لذا سيتم توضيح نطاق المشروع بعناية لتجنب التفسيرات المتعددة. نعمل على تقليل الاحتمالات للفهم الخاطئ والتوقعات غير الواقعية، حيث نعتبر أن التواصل الواضح والشفاف هو أساس نجاح أي مشروع.

مواصفات الجودة

تلتزم شركة عزوم المتحدة بمعايير الجودة ويتم التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاعمال حسب المواصفات الواردة في كراسة الشروط

مواصفات السلامة

يتم اتخاذ معايير السلامة في جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة العربية السعودية بشأن السلامة والصحة المهنية





ملخص نطاق العمل الذي سيتم تنفيذه:

1. المتطلبات ونطاق العمل:

سيتم تقسيم نطاق العمل حسب النقاط التالية:

أولاً: التجهيز الأولي للعمل:

(1) التخطيط

يعتبر حسن تخطيط المشاريع الخطوة الأولى نحو تحسين جودة إنتاج العمل مهما يكن. فمن خلال ضبط مراحل التخطيط في بناء المشاريع، يستطيع أصحاب العمل في المشاريع توفير الكثير من الجهد والوقت والمال. ولذلك سنقوم بعمل الاختبارات والدراسات اللازمة لإتمام العمل بالشكل المطلوب. وأيضاً القيام بعمل دراسات ربط المشروع بالشبكات الخدمية اللازمة للشغيل مثل (الكهرباء والمياه، الصرف الصحي، والانترنت).





*مراحل التخطيط:

أولاً: اختيار الموقع

بعد أن قامت إدارة (جمعية المودة للتنمية الاسرية) باختيار الموقع المناسب للمشروع يتبقى علينا الانتقال للمرحلة الثانية من مراحل التخطيط.

ثانياً: التصميم:

يجب أن يراعي التصميم المادّي للمشروع التركيب الداخلي والخارجي. بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بالمبنى الفعلي. حيث يساهم التصميم في الاستفادة الفعّالة من المساحة الموجودة، لضمان قدرة الفريق على العمل بأقصى سعة في جميع الأوقات. وهو الاختيار الأفضل بسبب أهمية أن تكون القياسات التي يمكن الحصول عليها دقيقة وغير مختصرة عندما يتعلق الأمر بقياس مساحة العمل. بالإضافة إلى الدقة في تسمية المناطق المختلفة وتحديد اتجاه سير العمل. بما في ذلك مسارات أداء العمل وكيفية الانتقال من مرحلة الى أخرى.

(2) مراحل ما قبل التنفيذ:

أولاً: تقديم جدول بيانات ثلاثة أنواع من جميع المواد ذات جودة عالية الى إدارة (جمعية المودة للتنمية الاسرية) من اجل الاختيار بينها وتحديد أي المواد المطلوبة، وتوريد عينات من هذه المواد.

ثانياً: تحديد موعد العمل والتنفيذ للمشروع.

ثالثاً: اصدار جميع التصاريح اللازمة والوثائق اللازمة من أجل البدء بالعمل والبدء بالتنفيذ.

رابعاً: استلام الموقع من إدارة (جمعية المودة للتنمية الاسرية).

ثانياً: مراحل التنفيذ مشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية واعمال المباني

لمشروع تجاري سكني





2) مرحلة التهيئة للتنفيذ:

مرحلة التهيئة للتنفيذ تعتبر من أهم مراحل التنفيذ حيث يتم فيها التأكد من جميع الاحتياجات

والنقاط المطلوبة، ومن هذه النقاط التالي:

أ. توفر جميع التصاريح والوثائق الحكومية والمطلوبة للبدء في تنفيذ الاعمال.

ب. توريد جميع المواد والمعدات اللازمة للتنفيذ.

ت. التأكد من توفر جميع الأيدي العاملة ذات الخبرة العالية للتنفيذ.

ث. تهيئة الموقع للعمل.





فريق العمل:

مدير المشروع	مسؤول الجودة	مهندس مدني/مهندس الإنشاءات	مهندس صيانة	مشرف البناء/الترميم	مساح	فني لياسة ودهان	فني تركيب أرضيات وبردورات	نجار/فني تركيب أبواب وشبابيك	فني تركيب أسطح وعزل	فني اعمال ميكانيكية	فنين سباكة وكهرباء	عامل صيانة عام
مسؤول عن إدارة وتنسيق جميع جوانب المشروع بما في ذلك التخطيط والتنفيذ والمراقبة. يجب أن يكون لديه خبرة سابقة في إدارة مشروع مماثلة وقد قاد وسلم بنجاح مشاريع كبرى في الماضي.	يضمن الالتزام بمعايير الجودة المحددة ويشرف على إجراءات التفيتيش والاختبار	المسؤول عن التصميم الهيكلي والإشراف على عمليات البناء والترميم. يعمل على ضمان سلامة الهياكل ومطابقتها للمعايير الهندسية	يركز على تحديد وتنفيذ الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة للمبنى، ويضمن استمرارية عمل جميع الأنظمة بشكل صحيح	المسؤول عن الإشراف المباشر على العمال والحرفيين في موقع البناء، وضمان تنفيذ الأعمال وفقاً للمخططات والمواصفات	يعمل على قياس وتحديد الأبعاد والمستويات في موقع البناء، ويضمن دقة التنفيذ وفقاً للتصاميم	متخصص في أعمال اللياسة والدهان، يعمل على تحضير الأسطح وتطبيق المواد بشكل احترافي	مسؤول عن تركيب الأرضيات والبردورات بشكل دقيق ومتقن	يقوم بتركيب الأبواب والشبابيك وضبطها وفقاً للمتطلبات الفنية	متخصص في تركيب مختلف أنواع المظلات، والعزل يعمل على تثبيتها بشكل آمن ومتين	يقوم بأعمال تركيبات التكييفات والحريق والتثبيت بشكل آمن	متخصص في اعمال السباكة والكهرباء والتمديدات والمتطلبات الفنية بجودة عالية.	يقوم بمجموعة متنوعة من أعمال الصيانة والإصلاح في المبنى



• المخرجات:


في الجدول التالي، سنقدم نظرة عامة على مخرجات هذا المشروع. التي نتعهد بتنفيذها بأعلى مستويات الجودة والدقة المطلقة:

#	المخرج	المواصفات
1	زيارة الموقع وتوفير المواد والمعدات المطلوبة	حسب المواصفات المطلوبة
2	تنفيذ أعمال تأهيل للموقع والهدم والازالة	حسب المواصفات المطلوبة
3	القيام بأعمال اعتماد المواد والتوريد المواد	حسب المواصفات المطلوبة
4	القيام بالأعمال المعمارية (المباني اللياسة الارضيات والاسقف)	حسب المواصفات المطلوبة
5	القيام بأعمال الكهربائية والميكانيكية	حسب المواصفات المطلوبة
6	القيام بأعمال الحريق وأنظمة التحكم	حسب المواصفات المطلوبة
7	القيام بأعمال تركيب الأبواب والقواطع الزجاجية	حسب المواصفات المطلوبة
8	القيام بأعمال الاختبارات والتسليم	حسب المواصفات المطلوبة
9	تسليم المشروع بعد الانتهاء من تنفيذ جميع البنود	حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها



المعدات والأجهزة

NO	Equipment	Manufacturing	Model	Country	Current Status	QTY
1	Bucklin Genziere	CAT-C	336 GC	England	Excellent	15
2	Bucklin Small Wheels	JINGGONG	JG100S	China	Excellent	12
3	Wheel Loader	CAT	2023	England	Excellent	15
4	Flatbed locomotive	Volvo	40 ft, 45 Ton	German	Excellent	20
5	Wheel Loader	CAT	2023	England	Excellent	15
6	Mercedes Flip Flob 16 CM	Mercedes	Mercedes 2023	German	Excellent	12
7	Diesel winch crane	CAT	25 Ton	England	Excellent	8
8	Truck 6 Ton	Mitsubishi	2022-2024	Japan	Excellent	12
9	Truck 12 Ton	Mitsubishi	2022-2024	Japan	Excellent	10
10	Truck 15 Ton	Mitsubishi	2022-2024	Japan	Excellent	16
11	Water Trucks	Mitsubishi	2022-2024	Japan	Excellent	25
12	Concrete Saw	YUANDONG	YK970	China	Excellent	25
13	Steel Tamper	Furd	25 cm depth	China	Excellent	23
14	Plate Compactor	CAT	2022-2024	England	Excellent	15
15	Small Compactor Steel wheels	Furd	FCS100	China	Excellent	20
16	Stone Saw	HZAR	600	China	Excellent	25
17	Space Device	Geo Max	ZAL 1024	China	Excellent	15

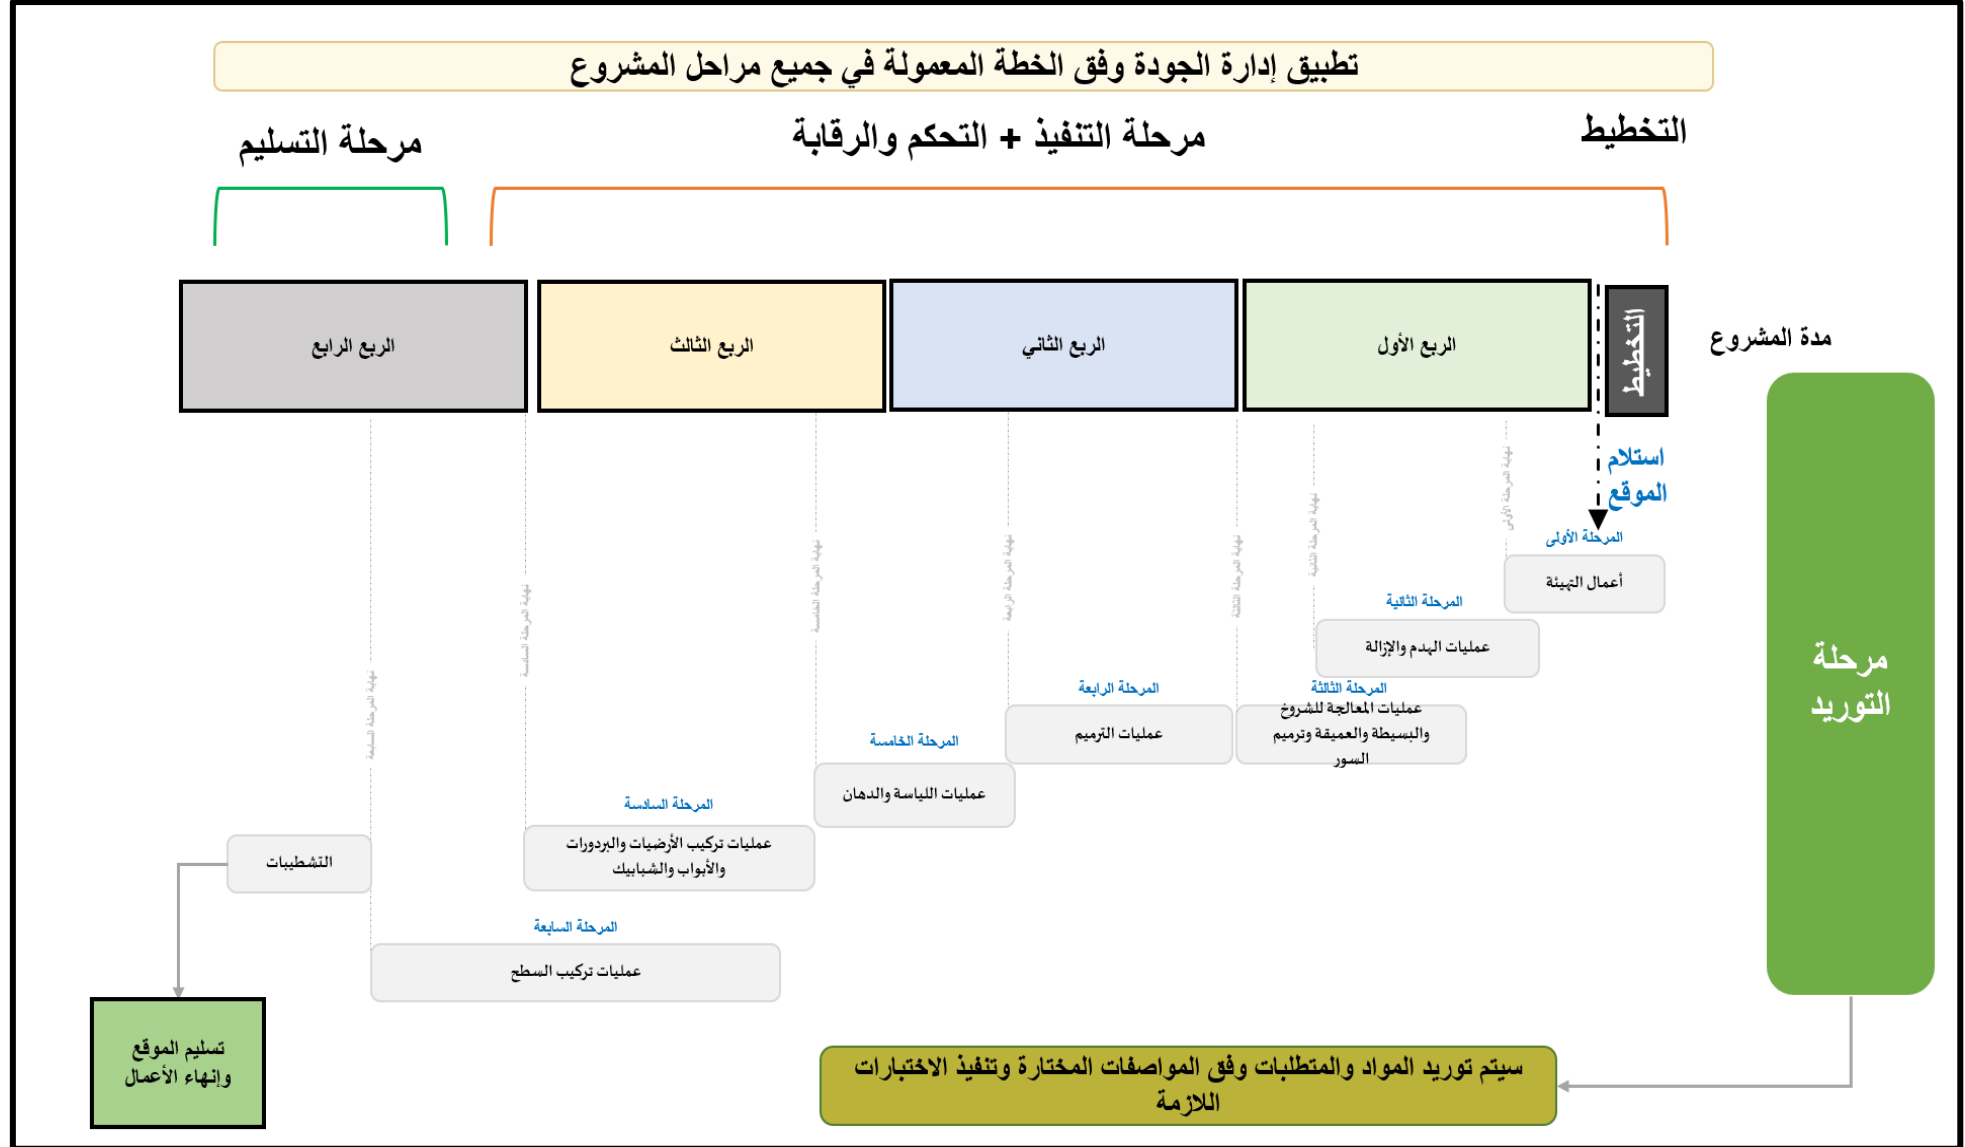



• مرحلة التخطيط:

مرحلة التخطيط هي الأساس في أي مشروع، فهي تحدد ما يجب تنفيذه وكيفية تنفيذه، وتوفر الإطار الذي من خلاله سيتم تحقيق أهداف المشروع. في هذه المرحلة، نقوم بتحديد الأهداف، وتحديد المتطلبات، وتطوير الجدول الزمني، وخطة العمل، والإجراءات، وخطة إدارة المخاطر. الهدف الرئيسي هو أن نضمن أننا قد تغطينا جميع جوانب المشروع وأنها قد أعدنا خطة عمل شاملة ومنظمة بشكل جيد توجهنا خلال مراحل المشروع.

وبناءً عليه فخلال مرحلة التخطيط سيتم عمل الآتي:

- سنقوم بعقد اجتماعات مفصلة مع الجهة المختصة لتحديد الخطة العامة وآلية العمل المتفق عليها، وضمان فهم دقيق لجميع تفاصيل المشروع.
- تنفيذ أعمال المخططات والتصاميم المطلوبة.
- استعراض المخططات للموافقة ولاعتماد.
- الاتفاق على آلية التقارير المقدمة من قبل الشركة والتي توضح حالة الإنجاز بشكل دوري (شهري أو اسبوعي)، وأيضاً أي تقارير يتم طلبها من قبل الجهة.
- التعاقد مع شركة لوجستية لخدمات الشحن والنقل وفق الاشتراطات التالية: تحمل نظام الهيدروليك لضمان سلامة المنقولات.
- تحديد شركات ومؤسسات التوريد وفقاً للمواد المعتمدة بالمشروع.
- تقديم جميع العينات المطلوبة بنطاق العمل للجهة المالكة وذلك للاعتماد والموافقة..
- تجهيز الموقع بشكل متكامل لاستكمال الأعمال (كهرباء ، تصاريح).
- تجهيز موقع إداري لمتابعة الأعمال. \سيتم تقديم جدول زمني محدد يحتوي على مراحل المشروع المستقبلي والمخطط لإتمامها.
- تحديد المخاطر المحتملة ووضع خطط للتقليل من تأثيرها أو التعامل معها.





● مرحلة التنفيذ:

هذه المرحلة ستقسم الى عدة مراحل حيث سيتم العمل بالتوازي:

○ عمليات تهيئة الموقع:

تتضمن هذه العمليات الآتي:

- سيتم إزالة جميع المخلفات الموجودة في الموقع ونقله للإمكانية استخدامه في مواقع مختارة من قبل الجهة.
- سيتم تجهيز المعدات في الموقع.
- سيتم تجهيز الموقع بجميع المتطلبات الفني

أولاً: الأعمال الإنشائية (Civil Works)

○ أعمال الحفر

نطاق العمل: يشمل تنفيذ أعمال الحفر لكامل المنطقة المحددة حسب المخططات وبالأعماق المطلوبة مع الالتزام بمتطلبات السلامة.

التوريد:

- توريد معدات الحفر (حفارات – شيلولات – قلابات).
- توريد أدوات القياس (ميزان قامة – شريط قياس – أوتاد تحديد).

التنفيذ:

- تحديد حدود الحفر وفق المخططات.
- إزالة الطبقات السطحية غير الصالحة.
- الحفر للوصول إلى المناسيب التصميمية.
- نقل ناتج الحفر إلى المواقع المعتمدة.

أدوات التنفيذ والمعدات:

- حفار 320 أو ما يعادله.
- شيلول 950.





- قلابات 16 م³.

- معدات سلامة (خوذ - أحذية - ستر عاكسة).

الفحص والاختبار:

- فحص المناسيب بواسطة ميزان القامة.

- التأكد من مطابقة أبعاد الحفر للمخططات.

التسليم:

- تسليم منطقة الحفر جاهزة لأعمال الإحلال والردم.

○ أعمال الإحلال

نطاق العمل: توريد وتنفيذ طبقات الإحلال المعتمدة حسب المواصفات.

التوريد:

- توريد مواد الإحلال (Subbase أو Selected Fill).

- توريد مياه للرش.

التنفيذ:

- فرد طبقات الإحلال على طبقات لا تتجاوز 30 سم.

- رش المياه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة.

- الدمك باستخدام مداحل 12 طن.

أدوات التنفيذ والمعدات:

- مدحلة 12 طن.

- شبول للفرد.

- رشاش مياه.

الفحص والاختبار:





• اختبار الكثافة الحقلية (Field Density Test)

• اختبار بروكتور للمادة.

التسليم:

• تسليم طبقة الإحلال مكتملة ومطابقة للاختبارات.

○ أعمال الردم بناتج الحفر

التوريد: لا يوجد توريد مواد، يتم استخدام ناتج الحفر الصالح.

التنفيذ:

• فرش الردم على طبقات.

• رش المياه.

• الدمك للوصول إلى الكثافة المطلوبة.

المعدات:

• مداحل – شيلولات – رشاش مياه.

الفحص:

• اختبار الكثافة الحقلية.

التسليم:

• تسليم الردم مطابق للمواصفات.

○ الخرسانة العادية

التوريد:

• توريد خرسانة عادية 250 كجم/سم².

• توريد خشب الطبلية – فواصل تمدد – مواد معالجة.





التنفيذ:

- تجهيز الأرضية.
- صب الخرسانة.
- تسوية السطح ومعالجته.

المعدات:

- خلاطات – هزازات – أدوات تسوية.

الفحص:

- اختبار الهبوط (Slump Test).
- أخذ مكعبات اختبار.

التسليم:

- تسليم الخرسانة بعد المعالجة.

○ اللبشة – الأساسات

التوريد:

- خرسانة 350 كجم/سم².
- حديد تسليح حسب المخططات.
- شبك سفلي وعلوي – فواصل – مواد معالجة.

التنفيذ:

- أعمال النجارة والحدادة.
- صب اللبشة باستخدام مضخة.
- المعالجة بالماء.

المعدات:





- مضخة خرسانة – هزازات – أدوات حدادة.

الفحص:

- فحص التسليح قبل الصب.
- اختبار الهبوط.
- مكعبات خرسانة.

التسليم:

- تسليم اللبشة جاهزة لأعمال الأعمدة.

○ الجدار الاستنادي – الأعمدة – الأسقف والكمروالسلالم

التوريد:

- خرسانة – حديد – خشب – فواصل – مواد معالجة.

التنفيذ:

- أعمال النجارة والحدادة.
- صب العناصر الإنشائية.
- فك الشدات بعد المدة المحددة.

المعدات:

- مضخة – هزازات – أدوات حدادة.

الفحص:

- فحص التسليح.
- مكعبات اختبار.

التسليم:

- تسليم العناصر الإنشائية مكتملة.





○ عزل أرضية البدروم والخزان

التوريد:

- رول عزل بيتومين – برايمر – مواد لاصقة.

التنفيذ:

- تنظيف السطح.
- دهان برايمر.
- تركيب رول العزل.
- اختبار المياه.

المعدات:

- شواكيش – رولر – أدوات فرد.

الفحص:

- اختبار الغمر بالماء لمدة 24 ساعة.

التسليم:

- تسليم العزل معتمد.

○ اعمال السكريد

التوريد:

- خرسانة سكريد جاهزة.
- مواد تسوية.

التنفيذ:

- فرد السكريد.
- تسوية السطح.





الفحص:

- فحص المناسيب.

التسليم:

- تسليم السطح جاهز للأرضيات.

○ عزل جدران البدروم والخزان

التوريد:

- رول عزل – برايمر – حماية للعزل.

التنفيذ:

- تنظيف الجدران.
- دهان برايمر.
- تركيب العزل.
- حماية العزل.

الفحص:

- اختبار المياه.

التسليم:

- تسليم العزل معتمد.

○ المبيدات – النايلون

التوريد:

- مبيدات معتمدة.
- رول نايلون مانع الرطوبة.





التنفيذ:

- رش المبيدات.
- فرد النايلون.

الفحص:

- التأكد من التغطية الكاملة.

التسليم:

- تسليم الموقع جاهز للخرسانة.

ثانياً: أعمال المباني (Block Works)

○ أعمال بلوك 10 – 20 – 25 – 30 – مقاوم للحريق

التوريد:

- بلوك حسب النوع.
- أسمنت – رمل – ماء.
- شبك معدني – مواد ربط.

التنفيذ:

- رفع المناسيب.
- بناء الجدران.
- تركيب الشبك عند الفواصل.
- تنفيذ اللياسة الأولية.

المعدات:

- أدوات بناء (مسطرين – ميزان – خيط).
- خلاطة صغيرة.





الفحص:

- فحص استقامة الجدران.
- فحص المناسيب.
- فحص نوع البلوك المقاوم للحريق.

التسليم:

- تسليم الجدران جاهزة لأعمال اللياسة النهائية.

○ أعمال النظافة والتشطيب وتسليم الموقع:

تتضمن هذه الاعمال الآتي:

- سيتم جمع جميع المخلفات الكبيرة مثل الألواح الزائدة، القطع المعدنية، والأكياس الفارغة.
- سيتم نقل المخلفات إلى مناطق التخلص المخصصة أو إعادة التدوير إذا كان ذلك ممكناً.
- سيتم التأكد من الموقع بالكامل وعدم وجود أي مناطق غير نظيفة.
- سيتم اصلاح أي اعطال ان وجدت قبل التسليم النهائي الموقع.
- سيتم عمل التقارير اللازمة للتسليم واعتماد المهندس المشرف.





• مرحلة التحكم والرقابة:

في هذه المرحلة سيتم نشر رقابة الجودة في مرحلة التنفيذ وذلك لضمان أن العمل المقدم يوافق أعلى المعايير والمقاييس ، فإن التحكم والرقابة يمثلان الضمان الحقيقي للنجاح. حيث تُعد الجودة هي الدرجة التي يتوافق بها الخدمة او المخرج مع المتطلبات المحددة. سيتم تطبيق وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المصممة لضمان الجودة، ومراقبة التقدم، وإدارة المخاطر، وتقييم الأداء. سوف نحافظ على نظام قوي للرصد والتحكم لنضمن أن المشروع يسير بشكل مستقر نحو الهدف. وبناءً عليه فسيتم تحديد معايير القبول للمخرج لجميع مراحل المشروع على أن يتم اعتمادها من قبل (مسؤول الجودة ، الجهة). وبذلك، في مرحلة التحكم والرقابة، سيتم تنفيذ العمليات التالية:



1. الرصد والتقييم المستمر للأداء: من خلال استخدام مجموعة من المنهجيات، سنتأكد من أن المشروع يتقدم كما هو متوقع.
2. التحقق من الجودة: سنقوم بإجراء التحقق من الجودة بانتظام للتأكد من أن العمل يفي بالمعايير المتفق عليها.
3. إدارة المخاطر: سنقوم بتحديد أي مخاطر محتملة قد تؤثر على المشروع وسنضع خطط لتجنبها أو التعامل معها.
4. التعديلات على الخطة: إذا كان ضرورياً، سنقوم بتعديل خطة المشروع بناءً على التحديات التي قد تظهر.
5. التواصل الفعال: سنقوم بتقديم تقارير منتظمة للجهة وجميع الأطراف المعنية لإبقائهم على اطلاع بتقدم المشروع.





وسيتم العمل بعمليات الجودة من خلال نموذج مراقبة الجودة وتقييم الامتثال، كما هو موضح ادناه:

1. وثيقة مراقبة الجودة

المراجعة النهائية		مراجعة الوثيقة		تقرير الامتثال / عدم الامتثال لمعايير جودة المنتج	الخدمة/المنتج	الوثيقة
التاريخ	التوقيع	التاريخ	التوقيع			

مثال من النماذج المستخدمة

2. تقييم الامتثال / عدم الامتثال

تقييم الامتثال / عدم الامتثال





مراجعة بواسطة			
مثال من النماذج المستخدمة			
تاريخ المراجعة			
السبب	عدم الامتثال	الامتثال	معايير الجودة

جميع مراحل المشروع	مدة مرحلة التحكم والرقابة
--------------------	---------------------------





• خطة إدارة المخاطر:

لهذا المشروع، سنولي أهمية كبيرة لإدارة المخاطر، نعتقد أن القدرة على التعرف على المخاطر المحتملة، تقييمها، والتخطيط للتعامل معها بشكل فعال يلعب دوراً أساسياً في تحقيق نجاح المشروع. لهذا السبب، تتبع خطة إدارة المخاطر الشاملة، والتي تتألف من ثلاث مراحل رئيسية:



الهدف من خطتنا لإدارة المخاطر هو تقليل الأثر السلبي لأي مخاطر محتملة، وتحقيق أفضل نتائج ممكنة للمشروع. وبناءً عليه سيتم توضيح خطة إدارة المخاطر كالتالي:

■ استكشاف المخاطر:

تم عمل تحليل نوعي للمشروع لاستكشاف المخاطر التي من الممكن حدوثها أثناء تنفيذ المشروع، وهي كالاتي:

1. - عدم توريد المواد الأولية في الوقت المحدد من قبل المورد.
2. - عدم مطابقة المواد للمواصفات.
3. - تغيب أو عدم قدرة أي عضو في الفريق من استكمال عمله





■ قياس المخاطر:

المخاطر	الاحتمالية	التأثير	الاستجابة
عدم توريد المواد الأولية في الوقت المحدد من قبل المورد	2	4	توفير عدة موردين إضافيين
عدم مطابقة المواد للمواصفات	1	4	التأكد على المواصفات المطلوبة من قبل مسؤول الجودة بشكل مستمر
تغيب أو عدم قدرة أي عضو في الفريق من استكمال عمله	1	4	وجود عدة (مهندسين/ فنيين) إضافيين في حال الاحتياج

#	1	2	3	4
الاحتمالية	غير متوقع	ممکن حدوثه	متوقع عالي	أكيد
التأثير	بسيط	متوسط	تأثير عالي	توقف

■ الاستجابة والمدة الزمنية:

#	الاستجابة	مدة الاستجابة	الشخص المسؤول
(1) الاستجابة (1) للخطر	توفير عدة موردين إضافيين	يوم واحد	مندوب المبيعات
(2) الاستجابة (2) للخطر	التأكد على المواصفات المطلوبة من قبل مسؤول الجودة بشكل مستمر	فترة المشروع كاملة	مسؤول الجودة
(3) الاستجابة (3) للخطر	وجود عدة (مهندسين/ فنيين) إضافيين في حال الاحتياج	يوم واحد	مدير المشروع



**• مرحلة الاختبار:**

في مرحلة الاختبار، نركز على التحقق من أن جميع نتائج المشروع تلبي المعايير والمتطلبات التي تم تحديدها في مرحلة التخطيط. هذه المرحلة تعد أمرًا حاسمًا لضمان نجاح المشروع وتنفيذ المتطلبات الخاصة بكم. نستخدم مجموعة من الأدوات والتقنيات من الاختبارات الدقيقة للتحقق من الجودة والتدقيق لضمان الامتثال للمعايير الداخلية والخارجية. والتي تتألف من المراحل الآتية:





• مرحلة التسليم:

في مرحلة التسليم، سيتم التأكد من ان جميع مخرجات المشروع تم تسليمها وفق الجودة المطلوبة، وتم تلبية جميع التوقعات والمعايير التي تم تحديدها في مرحلة التخطيط. نهدف دائمًا إلى التأكد من أن عملية التسليم تسير بسلاسة وفعالية، مما يسمح لنا بإغلاق المشروع، وستتم مرحلة التسليم وفق العمليات التالية:

1. -التأكد من تسليم جميع الأعمال المذكورة في بنود المشروع وفق نطاق العمل المتفق عليه.
2. تسليم جميع الأعمال بمحضر استلام رسمي.
3. تنظيف الموقع وتسليمه بهيئة قابلة لتنفيذ الأعمال وانهاء جميع الإجراءات.





مصفوفة المهام والمسؤوليات

المهام / الأشخاص	مدير المشروع	مسؤول الجودة	مهندس مدني/ مهندس الإنشاءات	مهندس صيانة	مشرف البناء/ الترميم	مساح	فني لياقة ودهان	فني تركيب أرضيات وبردورات	نجار/فني تركيب أبواب وشبابيك	فني تركيب اسطح	عامل هدم وإزالة	فني معالجة شروخ وترميم	عامل صيانة عام
إدارة المشروع	RA	R	R	I									
إدارة المخاطر	AC	R	R	I									
إدارة الجودة	R	RA	R	RA	R	R	R	R	R	R	R	R	R
التوريد والشحن	RA	R	R	R									
عمليات الحفر والردم	C	C	AR	R	R	R	R	C	C	C	R	C	C
عمليات الخرسانات	C	R	A	R	R	R	C	C	C	C	C	R	R
عمليات المباني	C	C	R	R	A	R		R		R	R	R	
عمليات العزل	CI	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
عمليات اللياسة والدهان	CI	R	R	R	R	R	A	C	R		R	R	R
عمليات تركيب الأرضيات والبردورات والأبواب والشبابيك	CI	R	R	R	R	R	R	R	AR		R	R	R
عمليات تركيب المظلات	CI	R	R	R	R	R	R	C	R	AR	R	R	R



إدارة الوثائق

إدارة الوثائق تمثل جزءاً حيوياً من عملية إدارة المشروعات في منظماتنا. نعتبر الوثائق الصحيحة والمحدثة بشكل منتظم أساساً للتواصل الفعال والشفافية في معالجة المشروع. خلال العمل على المشروع الحالي، سنقوم بتصنيف الوثائق إلى نوعين رئيسيين:

1. وثائق داخلية لإدارة المشروع، والتي تشمل:

- الدروس المستفادة.
- ملفات العروض المتعلقة بالمشروع.
- نطاق العمل والخط الأساسي المرجعي.

2. وثائق مخصصة للتشارك مع العميل، والتي تشمل:

- تقارير دورية توضح أداء العمل ونسب الإنجاز.
- معايير قبول المخرجات.
- نماذج استلام العمل.
- خطة إدارة المشروع.

سوف نتبع منهجية الوثائق (الإصدار: تاريخ ورقم الإصدار)، التي تسمح برصد جميع التغييرات على المستندات، ضماناً لتوفير أحدث الوثائق للعميل في جميع الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بإرسال تقارير دورية إلى العميل، توضح تقدم كل مرحلة من المراحل ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع لإكمال المخرج والمرحلة.





● إدارة التغيير وإدارة المعرفة:

ندرك جيداً أن المشروعات يمكن أن تتطور وتتغير بمرور الوقت، ونحن نتبنى منهجية مرنة تسمح بإدارة التغيير بفعالية. عملية إدارة التغيير تتضمن تقييم ومراجعة أي طلبات تغيير وتصنيفها في فئات مختلفة.

تتضمن عملية إدارة طلبات التغيير وفق المشروع إلى فئتين:

- تغييرات النطاق: هذه تتعلق بأي تغييرات يقترحها العميل لتحقيق الأهداف العامة للمشروع.
- تغيير في الكميات: هذا يمكن أن يكون بزيادة أو نقص في الكميات أو إضافة كميات جديدة بناءً على الاحتياجات الجديدة التي تظهر خلال تنفيذ المشروع.
- تغييرات التوثيق حيث يوجد أخطاء في توثيق المشروع .

الأدوار والمسؤوليات لطلب التغيير:

الموافقة	انشاء طلب التغيير	المسؤول
	X	مدير المشروع
X		ممثّل الجهة
X		الجهة ذات الصلاحية

آلية طلبات التغيير:

1. يقوم مدير المشروع برفع طلب التغيير موضحاً به نوع التغيير ووصفه، الغرض من التغيير، نوع التغيير: النطاق أو التوثيق أو الجدول وصف التأثير، والوثائق الداعمة.
2. تتم الموافقة على طلب التغيير من قبل العميل أو ممثّل الجهة
3. تتم الموافقة على طلب التغيير من قبل الجهة ذات الصلاحية.

● إدارة المعرفة:





تعتبر إدارة المعرفة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا في تنفيذ المشاريع، حيث نهدف للحفاظ على معرفة العمل التي تم تكوينها خلال المشروع ونقلها بطريقة منظمة ومناسبة لتسهيل الوصول إليها واستخدامها في المستقبل من قبل الجهة المستفيدة. وفي هذا الإطار، تم تقسيم نوع المعرفة والعمليات الخاصة بها إلى نوعين:

• وهي جميع الأعمال التي تم توثيقها سواء عبر المستندات أو خلافه

معرفة صريحة

• وهي جميع الأعمال التي تكون نابعة من الخبرة

معرفة ضمنية

• عمليات إدارة المعرفة في مالمشروع ومنهجيتنا بتنفيذها:

1. تحديد المعرفة: هنا نحدد أي نوع من المعرفة يمكن أن يكون ذا قيمة للمشروع ولأطراف المشروع المعنية.
2. توثيق المعرفة: هنا نوثق المعرفة التي تم تحديدها في صورة سهلة الفهم والوصول إليها.
3. تخزين المعرفة: نحن نتأكد من أن المعرفة الموثقة يتم تخزينها بأمان وبطريقة منظمة للرجوع إليها بسهولة.
4. توزيع المعرفة: نتشارك المعرفة المكتسبة مع أعضاء الفريق والأطراف المعنية بالمشروع للاستفادة القصوى منها.

من خلال الجدول التالي سيتم توضيح آلية نقل المعرفة في المشروع:

المعرفة الصريحة	المعرفة الضمنية
من خلال التقارير	من خلال اطلاع ممثل الجهة على الأعمال بشكل دوري
من خلال وثائق المشروع	من خلال التدريب الذي سوف يعقد بنهاية المشروع
من خلال الدروس المستفادة	من خلال المناقشات والاجتماعات والتي تساعد في تبادل الأفكار والتجارب، مما يساهم في توزيع المعرفة الضمنية





الحفاظ على سرية المعلومات

في هذا المشروع، ندرك تماماً أهمية الحفاظ على السرية والنزاهة وتوفير المعلومات الحساسة. إدارة السرية تعد عنصراً أساسياً في إدارة المشاريع التي نتولاها وتُجرى بأعلى مستويات الأمان والاحترافية. بصفتنا المسؤولين عن تنفيذ المشروع، نحن نعتبر وثائق المشروع والمعلومات المتعلقة به أمانة في أعناقنا. ونتعهد بأن نتعامل مع هذه المعلومات بكل حرص ونضمن أن يتم التعامل معها بشكل رسمي ومهني. وسيتم التعامل مع المستندات والمعلومات من خلال المنهجية الآتية:

جميع التواصل المتعلق بالمشروع، سواء كان من خلال البريد الإلكتروني أو المراسلات الورقية، يتم عبر القنوات الرسمية فقط

المدير المشروع هو الشخص الوحيد المصرح له بإرسال وتلقي المعلومات المتعلقة بالمشروع

يحظر استخدام البريد الإلكتروني الشخصي لتبادل المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالمشروع

يمنع تخزين الوثائق والمعلومات الخاصة بالمشروع على وسائط التخزين المحمولة مثل USB Drive

يمنع استخدام خدمات التخزين السحابي الخاصة لتخزين المعلومات المتعلقة بالمشروع

وبالإضافة إلى ذلك، نتبع أيضاً سياسة صارمة لتعيين الأدوار والصلاحيات للوصول إلى المعلومات، بحيث يتم منح كل فرد حق الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها فقط لأداء مهامه. كل هذه الإجراءات تضمن حفظ سرية المعلومات وتجنب أي تسريبات للمشروع.





خطة إدارة التواصل

التواصل الفعال أحد أهم مقومات نجاح المشاريع، وذلك عبر التواصل الدوري والفعال، يمكننا ضمان أن جميع الأطراف المعنية مطلعة على تقدم المشروع والتحديات التي تواجهها، والحلول المقترحة لها. وبناءً عليه فإن المنهجية المتبعة لخطة إدارة التواصل ستتم عبر العمليات الآتية:

- ✓ أولاً وقبل كل شيء، سيتم تحديد جميع الأطراف المعنية التي تحتاج إلى تواصل مستمر حول تقدم المشروع.
- ✓ استخدام قنوات الاتصال الرسمية فقط (مثل البريد الإلكتروني الرسمي، الرسائل النصية الرسمية، المكالمات الهاتفية، الاجتماعات الرسمية وغيرها).
- ✓ لضمان أن كل الأطراف المعنية على علم بتقدم المشروع، نقوم بإرسال تقارير دورية تحتوي على تفاصيل الأعمال التي تم إنجازها، الأعمال المقبلة وأي تحديات قد تواجهها.
- ✓ لضمان فعالية التواصل، نقوم بمراجعة خطتنا للتواصل بانتظام ونحدثها بناءً على الاحتياجات المتغيرة للمشروع.
- ✓ إدارة الاستفسارات والشكاوى: يتم توجيه جميع الاستفسارات والشكاوى إلى الجهة المناسبة للرد عليها بشكل فعال ومناسب.

في المشروع المطروح سيتم اتباع آلية إدارة التواصل الآتية:

نوع الاتصال	المسؤول	الأداة	الجهة المرسله	الجهة المستقبلة	المدة
تقرير الانجاز	مدير المشروع	الايميل	المقاول	ممثل الجهة	اسبوعي
تصعيد	مدير المشروع / ممثل الجهة أو مشرف الموقع	خطاب رسمي / ايميل	المقاول	ممثل الجهة	مباشر
طلب تغيير	مدير المشروع / ممثل الجهة أو مشرف الموقع	اجتماع	المقاول	ممثل الجهة	مباشر





التأثير البيئي والصحة والسلامة المهنية

نعتبر الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والاحترام للبيئة كجزء لا يتجزأ من عملنا، وعليه سيتم توضيح العمليات والأنظمة والممارسات التي نتبعها لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع أعضاء فريقنا، والحد من تأثير أنشطتنا على البيئة، ونسعى جاهدين لتحقيق التميز في كل جانب من جوانب الصحة والسلامة والبيئة. OSHA و ISO نحن نلتزم بمعايير في المشروع المطروح سيتم اتباع آلية العمليات التالية:

من أجل ضمان سلامة وصحة جميع الأفراد الذين يعملون لدينا، والمتأثرين بأعمالنا، قمنا بوضع مجموعة من معايير الأداء الرئيسية للبيئة والصحة والسلامة. هذه المعايير تتوافق مع متطلبات المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية مثل معايير ISO 14001 و OSHA.

أولاً، يتم تحديد المخاطر والتهديدات المحتملة للصحة والسلامة في جميع أنحاء المنظمة، من قبل مسؤولي البيئة والسلامة والصحة للتنسيق وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالبيئة والسلامة والصحة، وذلك من خلال تقييمات المخاطر المنتظمة والشاملة. يتضمن هذا البحث عن المواد الخطرة، والتعرض للضوضاء والاهتزاز، والعوامل الإرهاقية والمخاطر الميكانيكية.

ثانياً، نحن نقوم بتوفير تدريب مستمر لجميع الموظفين حول القواعد والإجراءات الخاصة بالبيئة و السلامة والصحة. يتضمن هذا التدريب التعامل مع (4) المواد الكيميائية والمعدات الخطرة، القيادة الآمنة، واستخدام معدات الحماية الشخصية.

ثالثاً، يجب على جميع الموظفين اتباع البروتوكولات والإجراءات المحددة للحد من التعرض للمخاطر. هذا يتضمن استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة، والالتزام بالإجراءات القياسية للعمل، والالتزام بقواعد النظافة والتعقيم.

رابعاً، نحن نقوم بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تحسين البنية التحتية والتجهيزات في الموقع. هذا يتضمن توفير إضاءة كافية، تهوية مناسبة، وإمكانية الوصول إلى مرافق الراحة والطوارئ.

خامساً، نحن نقوم بمراقبة الأداء الصحي والسلامة من خلال التدقيقات الدورية والتحقق من الامتثال للقواعد والإجراءات. تشمل هذه الأنشطة التفتيش على المعدات، والتحقق من سجلات التدريب، والتحقق من سجلات الإصابات والحوادث. نحن نحلل هذه البيانات للكشف عن أي أنماط محتملة أو مناطق ضعف في نظام السلامة والصحة المهنية ونقوم باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.





سادساً، نحن نشجع ثقافة السلامة في جميع أنحاء المؤسسة. نحن نحترم ونقدر مساهمات الموظفين في السلامة والصحة في العمل، ونشجعهم على التبليغ عن المخاطر والحوادث، والمشاركة في الجهود الرامية لتحسين السلامة والصحة في العمل. سابعاً، نحن نتعامل مع جميع الحوادث والأحداث الغير مرغوب فيها بجدية شديدة. نحن نتبع إجراءات محددة للتحقيق في الحوادث، ونقوم بتقييم الأسباب الجذرية، ونتخذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار هذه الأحداث.

نظام الأمن والسلامة

• حماية فريق وطاقم العمل و أيضا العملاء:

1. حماية العمال والكادر الفني والعملاء اثناء تنفيذ الأعمال:
 - الالتزام بنظام العمل والتنفيذ وفق المعايير الصحية والأمنية.
 - الالتزام بمعدات الوقاية الشخصية التي يجب على الموظفين والعمال استخدامها أثناء أنشطتهم الروتينية:
 - أ. قبعة الأمان الخاصة بالعمال ذات الجودة العالية لحماية الرأس.
 - ب. الكفوف ذات الجودة العالية والتي لا تتأثر بالكهرباء ومعدات البناء والنجارة.
 - ت. الزي الرسمي ذات الجودة العالية والتي تحمي العامل من الكهرباء ومن المواد المتطايرة اثناء تنفيذ الأعمال.
 - ث. قناع الوجه الذي يحفظ الوجه من أي مواد مرتدة.
 - ج. النظارات الخاصة بالعمال.
 - ح. الأحذية القوية المصنوعة من الجلد وممتنة بالفولاذ ومبطنة بالقماش.
 - إزالة نفايات العمل أولاً بأول.





2. حماية صحة العملاء والموظفين:

إن حماية فريق موظفينا تعني أننا نحمي أيضاً عملائنا ومنشأتنا، لذلك يجب على أعضاء فريقنا توفير ما يلي:

- جميع معدات الوقاية الشخصية اللازمة بما في ذلك أقنعة الوجه، ودروع الوجه، والنظارات الواقية، القفازات والأحذية وما إلى ذلك.
- مناديل مطهرة ومعقمات فردية لليدين وجميع الساعات الزمنية مقترنة بمحطات تعقيم اليدين.

- تم توفير تدريب مكثف على أساليب العمل الآمنة للموظفين.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة تدريب الموظفين على أساسيات العمل والتنفيذ لضمان بقائهم آمنين واتباع أفضل الممارسات لحماية الجمهور من نفايات العمل. التدريب شملت:

- أ. الطرق الصحيحة للأعمال والصيانة اثناء تواجد المدنيين او عدم تواجدهم.
- ب. الطرق الصحيحة للتنفيذ.
- ت. الطرق الصحيحة لارتداء معدات الوقاية لعمال البناء والتنفيذ.
- ث. التعرف على كيفية تجنب الأضرار الناتجة عن الكهرباء ومواد البناء اثناء العمل أو الصيانة.
- ج. استخدام ممارسات العمل الآمنة والأفضل في التنفيذ.
- ح. استخدام المواد بطريقة آمنة.
- خ. استخدام أدوات العمل بشكل امن كالأدوات المستخدمة في الكهرباء والمنشآت ومعدات البناء.

• توفير الزبي الرسمي لفريق العمل:

1. بدلة العمل بمواد جيدة تبعد تحافظ على الجسم من الأتربة والغبار.





2. بدلة العمال بمواد جيدة تحمي من الارتطام والمواد المتناثرة اثناء العمل.
 3. سترة في الشتاء.
 4. القفازات من النوع التي تستخدم عدة مرات وتحمي يدين العمال.
 5. الأقنعة.
 6. حماية العين كالنظارات.
 7. قبة السلامة.
 8. الأحذية ذات الخامات القوية.
- الدورات التدريبية والاختبارات:

تحتوي الدورات التدريبية على التمارين الأساسية التالية

1. تعلم الفريق كيفية إنجاز العمل بجودة عالية وفي الوقت المناسب.
2. كيفية إنجاز العمل مع الحفاظ على سلامة العملاء والمنشأة.
3. كيفية إنجاز العمل مع الحفاظ على سلامتهم.

- شهادات التدريب:

نحن لا نعمل فقط من أجل إثبات أننا نفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة من خلال الحصول على الشهادة، ولكن يمكننا أيضاً إثبات أننا مستعدون للقيام بعمل رائع والمساعدة في توفير شكل رائع للمدينة وبعمل ذات جودة عالية جداً. على وجه التحديد ونحن نقدم نوعين من الشهادات


1. شهادات النجاح:
2. شهادات الثقة والإدارة:





معايير الجودة

نحن نتأكد من أننا في أفضل وضع للقيام بعمل البناء والانشاءات والتأهيل للمباني والبنية التحتية بشكل جيد لأننا نلتزم في العمل لدينا بمعايير الجودة العالمية في التأهيل والبناء. يتضمن هذا بشكل عام استخدام أفضل الممارسات والتأكد من أننا ندير عمل التأهيل والبنية التحتية بشكل فعال وأن العاملين لدينا على استعداد تام لبذل قصارى جهدهم في تنفيذ العمل على أكمل وجه وبالوقت المناسب حيث وأننا نمتلك الأدوات اللازمة التي تجعلنا على يقين من أننا مستعدون لتوفير حياة نظيفة وجميلة وامنة وذات جودة عالية تستمر لأكبر وقت ممكن.

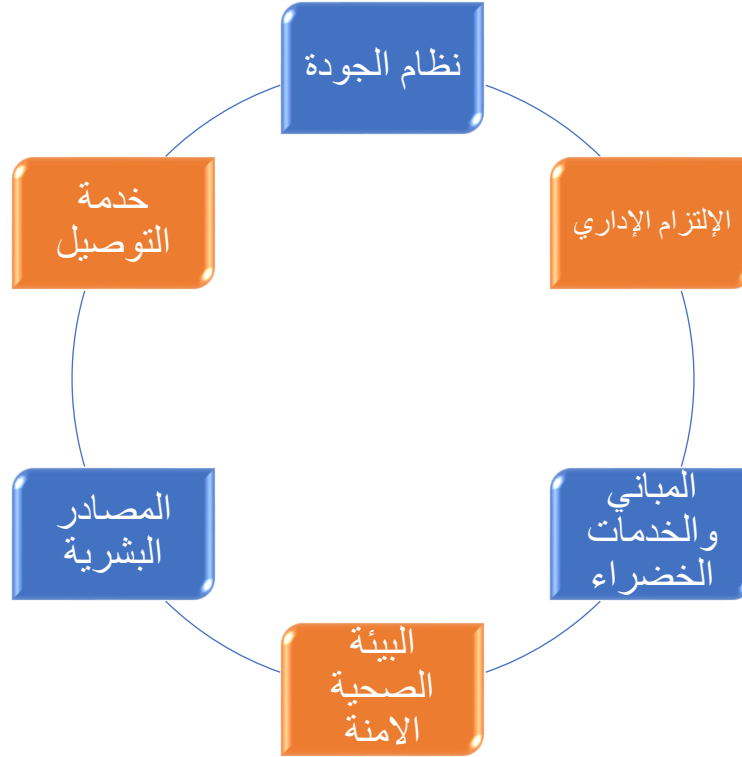

• تصنيفات معايير الجودة

1. الجودة الفنية:

- أدوات.





- عامل (الرائحة، المظهر، الصداقة البيئية).

- نظام التخطيط.

- الأسعار.

- الفواتير.

- تحديد الموقع.

2. الجودة الوظيفية:

- روح الخدمة.

- المرونة.

- الوضوح في التواصل.

- موقف العمل.

- القدرة على التعاون.

● محددات الجودة:

1. التكلفة (السعر)

2. موثوقية مقدم الخدمة.

3. الاستجابة للكوارث وحل الشكاوى.

4. احتياجات العملاء وتوقعاتهم.

5. مبادئ التنظيم وآليات العمل (الاستخدام الكفاء للموارد والتكنولوجيا، تحليل

المنافسة، الخ).

6. جودة التأهيل والأداء بشكل عام.

● إدارة الجودة:

إدارة الجودة هي فريق مجلس إدارة يحمل العديد من التعريفات اعتمادًا على

الموقف المطبق الذي يمكن استخدامه فيه. توجد تعريفات مختلفة يمكن تطبيقها

في خدمات البناء والتأهيل والبنية التحتية والتي يمكن تعريفها بوضوح على





النحو التالي:

- النظام الذي يشمل تأمين الجودة وتحسين الجودة، ويصف برنامج تقييم جودة الخدمات باستخدام تقنيات متنوعة.
- تطبيق نظام إدارة الجودة في إدارة العملية لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء بأقل تكلفة إجمالية للمنظمة مع الاستمرار في تحسين العملية.
- جهد مستمر لتقديم الخدمات التي تلي توقعات العملاء أو تتجاوزها من خلال عملية منظمة ومنهجية لخلق مشاركة تنظيمية في تخطيط وتنفيذ تحسينات الجودة.





نموذج قائمة فحص العمل والأداء

نطلب دائماً من العمال والمشرفين والمديرين لدينا ملء قائمة مراجعة العمل النهائي (قائمة فحص الجودة) للتأكد من أنهم قاموا بالعمل على أكمل وجه وفي الوقت المناسب ووفقاً لمعايير الجودة لدينا، بناءً على النموذج التالي:

م	المهام المحددة في البناء والانشاءات			الفحص (استخدم (ص) للعمل المنجز و(خ) للعمل الغير منجز)
	المهام	المهندسين	الاداريين	تأكيد العميل
1	ازالة المخلفات			
2	هدم الرصف			
3	الحفر			
4	توفير المعدات			
5	توفير الأدوات اللازمة حسب المخطط والمطلوب			
6	عملية الدك			
7	البدء بأعمال الكهرباء			
8	البدء بأعمال التكييف والتهوية			
9	أعمال اعزل المائي والحاراري			
10				

رقم الفحص (.....)	اسم المهندس	اسم الاداري	التاريخ .../.../2024م
المهندس	☐ سيئ جداً ☐ سيئ ☐ متوسط ☐ جيد ☐ جيد جداً ☐ ممتاز	التوقيع هنا	
الاداري	☐ سيئ جداً ☐ سيئ ☐ متوسط ☐ جيد ☐ جيد جداً ☐ ممتاز	التوقيع هنا	
العميل	☐ سيئ جداً ☐ سيئ ☐ متوسط ☐ جيد ☐ جيد جداً ☐ ممتاز	التوقيع هنا	
ملاحظات			





Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

الشهادات والوثائق الرسمية

• السجل التجاري:

وزارة التجارة
Ministry of Commerce

شهادة السجل التجاري

شركة عزوم المتحدة للمقاولات

البيانات الأساسية للسجل التجاري

7003868077

الرقم الوطني الموحد: 7003868077

تاريخ الإصدار: 08/01/2017

نوع الكيان: شركة ذات مسؤولية محدودة

صفات الشركة : لا يوجد

حالة السجل: نشط

@XfD
mcgovsa

1900
mc.gov.sa





Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

• شهادة التصنيف:

6/1

شهادة

تصنيف مقدمي خدمات المدن

منح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شهادة تصنيف بالدرجة

عزوم المتحدة للمقاولات
للمنطقة

بيانات المنشأة	رقم السجل التجاري / الترخيص	تاريخ إصدار السجل التجاري / الترخيص	اسم ملكة المنشأة	نوع المنشأة	بنسبة للمنشأة	رأس المال
	1010467099	07/01/2017	يحي حسن	ت مسؤولية محدودة	سعودي	100,000

بيانات شهادة التصنيف	رقم الشهادة	تاريخ الإصدار	حجم المنشأة	درجة التقييم الائتماني	درجة التقييم الفني
	2023012600	18/12/2023	متوسطة	BBB+	81.225

نشطة شهادة التصنيف	القطاع	النشطة
	التشييد والبناء	جمع المياه وتنقية المياه، تحلية المياه ونقل وتوزيع المياه، التخلص من مياه المجاري، تشغيل شبكات ومرافق معالجة الصرف الصحي، خدمات جمع النفايات البلدية، جمع المواد لإعادة التصنيع

- يبرز في مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ 18/12/2026

- تصدر هذه الشهادة إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشروع التحق من الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة

وكليل الوزارة للتخطيط وتنظيم المدن

بإشراف

براهيم بن حسين الصقر





6/3



الدرجة الأولى

ملحق الشهادة

الهيئة العامة للمياه والكهرباء

وزارة المياه والكهرباء

السلطة العامة للمياه والكهرباء

عزوم المتحدة للمقاولات

1010467099

اسم المنشأة

رقم السجل التجاري / الترخيص

المنطقة

إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع، ترميمات المباني السكنية وغير سكنية، إنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق، إنشاء الجسور والإنفاق، إنشاء خطوط السكك الحديدية، إنشاء مهابط المطارات، إصلاح وصيانة الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق، إصلاح وصيانة الجسور والأنفاق، تمديد الانابيب باختلاف أنواعها للكهرباء والاتصالات وغيرها، تمديد انابيب النفط والغاز، تمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها وإنشاء شبكات جديدة لإنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، إصلاح وصيانة المحطات والشبكات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، إنشاء قنوات الري والسقي وأبراج تخزين المياه الرئيسية، حفر آبار المياه الأنبوبية، حفر آبار المياه اليدوية، إصلاح وصيانة قنوات الري والسقي وأبراج تخزين المياه الرئيسية، إصلاح وصيانة محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، إصلاح وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والمحولات، إصلاح وصيانة محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار، إنشاء محطات والمضخات، إنشاء وإقامة محطات الطاقة الكهربائية والمحولات، إنشاء وإقامة محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار، إنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي، إنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، إنشاء الموانئ والمراسي السياحية (المارينا)، إنشاء السدود، تنظيف الممرات المائية، إنشاء كاسرات الأمواج والحماية للأرصفة، الإنشاءات العامة الرياضية وتشمل الملاعب، أعمال تشييد الميادين العسكرية، إصلاح وصيانة السدود، إصلاح وصيانة أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، هدم وإزالة المباني وغيرها، إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية، صب القواعد والأساسات، سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع، القطع الصخري باستخدام المواد المتفجرة، تمديد الأسلاك الكهربائية، تمديد أسلاك الاتصالات، تمديدات الشبكات، تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والاستلايت، تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات، تركيب أنظمة الإضاءة، تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق، تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية، تركيب وصيانة أجهزة السلامة المرورية، تركيب أنظمة التدفئة بالكهرباء أو الغاز أو الزيت، وصيانتها وإصلاحها، تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها وإصلاحها، تركيب الأدوات الصحية وصيانتها وإصلاحها، تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصلاحها

القطاع

التشييد والبناء

نسخة شهادة التصنيف

توقيع المدير العام للمياه والكهرباء

18/12/2026

م. فيصل بن حسين الصقر

- يبرز مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ 18/12/2026

- تصدر هذه الشهادة إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشايخ التحقق من الشهادة المطبوعة من خلال موقع الوزارة









6/4

ملحق الشهادة

عزوم المتحدة للمقاولات

1010467099

اسم المنشأة

رقم السجل التجاري /الترخيص

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

[illegible]

وكليل الوزيرة للتعليم عيسى العيسى

و القضاة من حسين الصغار

- يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ 18/12/2026

- تصدر هذه الشهادة إلكترونياً وعلى الجهات المالكة لمشاريع التحقّق من الشهادة المنظمة من خلال موقع الوزارة.





Technicial Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

6/5

ملحق الشهادة

الدرجة الأولى

عزوم المتحدة للمقاولات

1010467099

اسم المنشأة

رقم السجل التجاري بالترخيص

النشطة	القطاع
أعمال تركيب الطابوق، أعمال تركيب الصخور، إنشاء حمامات السباحة، تنظيف المباني بالبخار وتسخين الرمل، تركيب وصيانة الوحدات المسبقة الشد لإجهادات الخرسانة، تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT VNO)، تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات (AVL)، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بتصميم واجهة وتجربة المستخدم، تقنيات الروبوت، تقنيات الذكاء الاصطناعي، حلول التقنية المالية، تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات، الأمن السيبراني، التنظيف العام للمباني، تنظيف خارجي للمباني، تنظيف متخصص للمباني، يشمل المداخل والنوافذ وغيرها، تنظيف وصيانة برك السباحة، أنشطة التطهير والتبخير لإزالة الحشرات والقوارض، تنظيف الثلاجات ما عدا الطائرات، أنشطة تنظيف الآلات والمعدات الصناعية، أنشطة تنظيف الطرق، تنظيف الطائرات، أنشطة خدمات الإصحاح البيئي، رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام، رعاية وصيانة مناظر المباني والحدائق المنزلية وحدائق الأسقف وواجهات المباني الخاصة وغيرها، رعاية وصيانة منتزهات الطرق السريعة، رعاية وصيانة أراضي الملاعب الرياضية وملاعب الجولف، رعاية وصيانة المياه الساكنة والجارية، يشمل (الأحواض والبحيرات وممرات المياه وحمامات السباحة والمناطق المبللة)، رعاية وصيانة نباتات الحماية من الضجيج والرياح والتصحح، أنشطة خدمات تصميم المناظر الطبيعية، أنشطة خدمات صيانة الأراضي للحفاظ عليها صالحة زراعيًا وبيئيًا، تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات	التشييد والبناء

د. محمد بن عبد الله بن عبد العزيز

رئيس مجلس إدارة الشركة

18/12/2026 - يبرري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ

- تصدر هذه الشهادة إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشايخ التحقق من الشهادة المعلقة من خلال موقع الوزارة.





6/5



الدرجة الأولى

ملحق الشهادة



عزوم المتحدة للمقاولات

1010467099

اسم المنشأة

رقم السجل التجاري / الترخيص

النشاط	القطاع
أعمال تركيب الطابوق ، أعمال تركيب الصخور، إنشاء حمامات السباحة ،تنظيف المباني بالبخار وتسخين الرمل ،تركيب وصيانة الوحدات المسبقة الشد لأجهادات الخرسانة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) ،تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء IoT VNO، تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات، (AVL) تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بتصميم واجهة وتجربة المستخدم، تقنيات الروبوت، تقنيات الذكاء الاصطناعي، حلول التقنية المالية تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات، الأمن السيبراني، التنظيف العام للمباني، تنظيف خارجي للمباني، تنظيف متخصص للمباني ، يشمل المداخل والنوافذ وغيرها، تنظيف وصيانة برك السباحة، أنشطة التطهير والتبييض لإبادة الحشرات والقوارض، تنظيف الدفلات ما عدا الطائرات، أنشطة تنظيف الآلات والمعدات الصناعية، أنشطة تنظيف الطرق، تنظيف الطائرات، أنشطة خدمات الإصحاح البيئي، رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام، رعاية وصيانة مناظر المباني والحدائق المنزلية وحدائق الأسقف وواجهات المباني الخاصة وغير هار، رعاية وصيانة منتزهات الطرق السريعة، رعاية وصيانة أراضي الملاعب الرياضية وملاعب الجولف ، رعاية وصيانة المياه الساكنة والجارية ، يشمل، (الأحواض والبحيرات وممرات المياه وحمامات السباحة والمناطق المبللة)، رعاية وصيانة نباتات الحماية من الضجيج والرياح والتصحح، أنشطة خدمات تصميم المناظر الطبيعية، أنشطة خدمات صيانة الأراضي الحفاظ عليها صالحة زراعيًا وبنياً، تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات	التشييد والبناء

وکیل الوزارة للتشغيل مشغلي المدن

18/12/2026

وکیل من ضمن الصفح

- يبري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ 18/12/2026

- تصدر هذه الشهادة إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشايخ التحقق من الشهادة المقدمة من خلال مواقع الوزارة







Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

6/6

ملحق الشهادة

الدرجة الأولى

عزوم المتحدة للمقاولات

1010467099

اسم المنشأة

رقم السجل التجاري للترخيص

النشاط	القطاع
تنظيم وإدارة الحشود، تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات، التشغيل الطبي للمستشفيات	التشييد والبناء

وکیل الوزارة للتخطيط وتنظيم المدن

بإشراف

برفیسر من حسن الصفا

18/12/2026

- يبري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ 18/12/2026

- تصدر هذه الشهادة إلكترونياً وعلى الجهات المالكة المشاريع التحقق من الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة.





Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

• شهادة اشتراك الغرفة التجارية:



شهادة اشتراك Membership Certificate

غرفة الرياض
Riyadh Chamber

Membership No. :	414250	414250	رقم العضوية الموحد :
Date of Issue:	06/ 07/ 2017	2017/ 07/ 06	تاريخ الاصدار:
Membership Class :	Forth	الرابعة	درجة العضوية :
Riyadh Chamber Certifies			تشهد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن عزوم المتحدة للمقاولات
Commercial Registration No.	1010467099	1010467099	مقيدة بالسجل التجاري / الترخيص رقم :
Certificate Expires on	03/ 10/ 2024	2024/ 10/ 03	ينتهي سريان هذه الشهادة في



الخدمات الإلكترونية لغرفة الرياض - بوابة أعمال
E-Services Riyadh Chamber ©

920004565

- يلزم التحقق من الوثيقة عبر الرابط <https://mybusiness.chamber.sa> ، أو تطبيق (سند)
- للأجهزة المحمولة أو الرقم الموحد دون ادنى مسؤولية على الغرفة عن محتوى الوثيقة.
- تعد هذه الورقة من الوثائق الإلكترونية لغرفة الرياض، ويمنع تعديلها اول محاولة العبث بها وتصبح لاغية حال محاولة تعديلها وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية.





Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

• شهادة الزكاة:



TIN ٣١١٩١٧٥٢٧٤ الرقم المميز
Certificate No. ١٠٢٢٣٠٠٠٥٢٧٨٦٧٨ رقم الشهادة
Certificate date ١٤٤٥/٠٦/١٢ تاريخ الشهادة



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة تسجيل Registration Certificate

The Zakat, Tax and Customs

Authority certifies that the Taxpayer

تشهد هيئة الزكاة والضريبة

والجمارك أن المكلف /

عزوم المتحدة للمقاولات

Entity Unified No. /ID No

٧٠٠ ٣٨٦٨٠ ٧٧

الرقم الموحد للمنشأة / رقم هوية

Commercial Registration/License /
Contract No

١٠١٠ ٤٦٧٠ ٩٩

سجل تجاري / رخصة / عقد رقم

Is registered on 16/04/1445 AH corresponding to 31/10/2023 AD

مسجل لديها بتاريخ ١٦ ٠٤ ١٤٤٥ هـ الموافق ٣١ ١٠ ٢٠٢٣ م

The sixteenth of Rabi' al-thani one thousand four hundred forty-five
(Hijri)

(السادس عشر من ربيع الثاني ألف و أربعمئة و خمسة و أربعون هجري)

Was granted this certificate to complete all transactions except for the
.final contract amounts due to him

وقد منح هذه الشهادة لإنهاء جميع معاملاته ما عدا صرف مستحقاته
النهائية عن العقود.

يمكن التحقق من صلاحية الشهادة عبر موقع الهيئة www.zatca.gov.sa

The validity of the certificate can be verified via the Authority's Website www.zatca.gov.sa

zatca.gov.sa

19993

@zatca_sa



هذه الوثيقة مستخرجة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
و لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة
www.zatca.gov.sa





Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

• شهادة منشآت:



رقم الشهادة: 23499122127

تاريخ الإصدار: 21-12-2023

اسم المنشأة: عزوم المتحدة للمقاولات

صلاحية الشهادة: سنة من تاريخ الإصدار *

الرقم الوطني: 7003868077

السجل التجاري: 1010467099



تشهد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بأن المنشأة المذكورة أعلاه تدرج من ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف المعتمد لدى "منشآت"

يتم التحقق من الشهادة من خلال موقع منشآت

<https://profile.monshaat.gov.sa/validate>

تعد هذه الشهادة من الوثائق الحكومية الرسمية، ولا يجوز تداولها أو استعمالها إلا في حدود الأغراض التي أصدرت لأجلها، ويحظر قطعياً تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من أنواع التعديل، وتعد هذه الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، كما تعرض من ارتكب أي مما سبق إلى الملاحقة النظامية أمام الجهات المختصة دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.

* يجب التحقق من خلال رابط موقع منشآت عن صلاحية الشهادة حيث أنه يتم التحديث بشكل دوري





Technical Offer



AZOOM United Co.

Ref. ASF26071502 · 15/07/2026

• شهادة التأمينات:

التاريخ ١٤٤٥/١١/٠٦
الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٤
رمز الشهادة ٥٩٧١٩٩٦٤



شهادة

إسم المنشأة : عزوم المتحدة للمقاولات
الرياض

الرياض
السعودية

رقم الاشتراك : ٥٢٤٤٩٨٦٢٢٦

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٤٦٧٠٩٩

مصدره :

كتابة
واحد و تسعون مشتركا
ماتتين و سبعة مشتركا
ماتتين و ثمانية و تسعون مشتركا

رقما
٩١
٢٠٧
٢٩٨

عدد المشتركين السعوديين
عدد المشتركين غير السعوديين
المجموع

تشهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه قد أوفت بإلتزاماتها تجاه المؤسسة
وأن التبدلات السدنة منها حتى تاريخ إصدار هذه الشهادة ، والتي تم منحها لتعويضها لأية جهة تطلبها ، وهي
صالحة لجميع الأغراض التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية في المادة (١٩/٦) منه.

هذه الشهادة سارية المفعول حتى ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ.

أو عن طريق استخدام
الرمز المعرف التالي :



يلزم التحقق من صحة وصلاحيه الشهادة عبر زيارة الرابط
أداء في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

www.gosi.gov.sa/vc

(الشهادة معتمدة من صاحب الصلاحيه ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)

ننهادة



www.gosi.gov.sa
800 1243344



تعد هذه الشهادة من الوثائق الإلكترونية الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها سواء بالإضافة أو الحذف
أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من أنواع التعديل ، وتعد الشهادة لاغية إذا شابهها شيء من ذلك ، كما تعرض صاحبها للملاحقة النظامية
أمام الجهات المختصة بالإضافة إلى مايفرضه نظم التأمينات الاجتماعية من عقوبات ، ولايجوز تداول الشهادة إلا في الأغراض التي
أصدرت لأجلها وفقا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير مسؤولة عن أي آثار أخرى مترتبة
قبل الغير عن الشهادة وغير مسؤولة عن أي عملية تزوير أو تعديل تتم على البيانات الواردة فيها .

التأمينات الإلكترونية
إمكانيات من مميزات



• شهادة السعودة:

Certificate ID / رقم الشهادة
209096-15114786



تاريخ الإصدار: 24/01/2026 • تاريخ انتهاء الصلاحية: 03/05/2026

02/02/2026	تاريخ التجديد/التحديث
تم التحقق	حالة الشهادة
عزوم المتحدة للمقاولات	اسم المنشأة:
1-2868149	رقم المنشأة:
—	رقم الترخيص:
7003868077	الرقم الوطني الموحد:
بلايني	مستوى نطاقات الحالي:
71 %	معدل التوطين:

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه حققت نسبة التوطين المطلوبة وتم منحها هذه الشهادة بناء عن طلبها. الشهادة تم إنشاؤها إلكترونياً ومعتمدة من الجهة المختصة ولا تحتاج الى ختم
اه تهقو

